



RELAZIONE

Stato di attuazione attività tecnico-amministrative

Agosto 2020

1. PREMESSA.....	2
1.1 Inquadramento territoriale.....	2
1.2 I numeri dell'agibilità.....	3
1.3 Primi interventi di riparazione degli immobili danneggiati	4
1.4 Monitoraggio attività ex art. 25 (Condoni).....	5
1.5 Attuazione OCDPC 587/2019.....	6
1.6 Ricostruzione privata.....	6
1.7 Ricostruzione pubblica - scuole	6
2. ALLEGATO 1A – IMMOBILI PER I QUALI È STATA RIPRISTINATA L'AGIBILITÀ CON PERIZIA TECNICA	7
3. ALLEGATO 1B – REPORT PRIMI INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMMOBILI DANNEGGIATI	8
4. ALLEGATO 2 – REPORT INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	12
5. ALLEGATO 3 – REPORT INTERVENTI URGENTI	23
6. ALLEGATO 4 – REPORT INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BENI CULTURALI.....	32
7. ALLEGATO 5 – REPORT RICOSTRUZIONE PRIVATA	46
8. ALLEGATO 6 – REPORT DEL PIANO PER IL RIPRISTINO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.....	56



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

1. PREMESSA

Il giorno 21 agosto 2017 l'isola d'Ischia fu interessata da una serie di eventi sismici che causarono danni ingenti in un'area abbastanza limitata compresa tra i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola. All'evento principale, avvenuto alle 20.57, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia assegnò una **magnitudo locale** pari a 3.6, per poi precisare che la **magnitudo durata**, utilizzata per misurare eventi in area vulcanica, era pari a 4.0, confermando un ipocentro superficiale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 agosto 2017, dichiarò, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che interessò il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.

Con successiva delibera del consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, fu dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza all'evento sismico, per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.

1.1 Inquadramento territoriale

I Comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017, e per i quali si svolge l'attività assegnata al Commissario per la Ricostruzione, occupano una superficie totale di circa 21 km² con una popolazione residente pari a circa 31000 abitanti.

I danni più significativi si sono concentrati nella parte pedemontana a circa 100 m dalla linea di costa, nella zona che va da piazza Maio fino alla località Fango, tra i Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, interessando anche una limitata zona di confine tra quest'ultimo Comune e il Comune di Forio. Comunque danni da lievi a gravi si sono manifestati, se pure puntualmente, su tutto il resto dei territori comunali, interessando abitazioni private, viabilità, scuole e altri edifici pubblici; in diversi casi il sisma ha anche accentuato una pregressa compromissione delle condizioni di rischio idrogeologico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Sin dalle prime fasi di attività della Struttura Commissariale, a mente delle competenze assegnate dal D.L. 109/2018, è apparso necessario dotarsi di un Sistema Informativo Territoriale per la mappatura del danno e dei rischi e per la gestione georeferenziata dei dati e delle informazioni dei piani per la ricostruzione.

A tal fine, mutuando i precedenti rapporti con il Dipartimento della protezione civile, è stata avviata una collaborazione con la Regione Piemonte, per il tramite del Presidente, che ha consentito di realizzare in house, utilizzando software liberi e gratuiti, il sistema Erikus-ric, da cui sono estratte la maggior parte delle informazioni che si riportano a titolo di sintesi nella tabella allegata (*Tabella 1.2.1*).

1.2 I numeri dell'agibilità

Dal rilievo dell'agibilità e censimento del danno, avviato dal Dipartimento della protezione civile e continuato dal Commissario Delegato per l'emergenza mediante schede Aedes, sulla base delle istanze formulate dai cittadini e dai sindaci per gli edifici pubblici, risultano ispezionati circa n. 2300 edifici (su un totale di circa 9800 edifici esistenti) di cui, secondo diversi livelli di gravità, circa n. 1570 inagibili in tutto o in parte e per i quali sono state emesse ordinanze sindacali di sgombero, determinando la nota quantità di sfollati, la cui assistenza è ancora a cura del Commissariato per la ricostruzione.

Ai fini della comprensione dell'impatto territoriale del sisma sui comuni interessati, si rileva che su circa 9800 edifici esistenti nei 3 Comuni, circa 780 ricadono in zone perimetrate R3 e R4 dai Piani di Assetto Idrogeologico dell'autorità di Bacino (di cui circa 100 danneggiati dal sisma), mentre nelle aree di attenzione per rischio idrogeologico, come cartografate dagli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 effettuate ricadono circa 1600 edifici, di cui circa 190 danneggiati (quest'ultimi possono in parte essere ricompresi nel conteggio delle zone R3 e R4 di cui sopra).

Le Zone rosse a seguito del Sisma, perimetrate con ordinanza sindacale, coprono una superficie di 0,07 km² per il Comune di Casamicciola (1,2% della superficie del territorio comunale) con 125 edifici danneggiati, mentre il Comune di Lacco Ameno ha una zona rossa pari a 0,012 km² per (0,6 % della superficie del territorio comunale) con 48 edifici danneggiati; il Comune di Forio non ha una zona rossa (*Tabella 1.2.1*).



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Comune	Superficie Comunale (km ²)	Edifici totali (1)	Edifici inagibili (1)	Zona Rossa (2) (km ²)	Edifici in zona rossa (di cui con danno)	Edifici in R3 e R4 (di cui con danno)	Edifici in zone di attenzione MS (di cui con danno)	Totale edifici riparati (4)	Permessi a costruire post-condono (esito favorevole e silenzio assenso) (5)
Casamicciola	5,85	2879	759	0,079	175 (125)	Rischio frana 149 (50) Rischio idr. 17 (12)	488 (143)	30	38
Lacco Ameno	2,07	1434	276	0,012	66 (48)	Rischio frana 33 (14) Rischio idr. 43 (10)	135 (53)	57	15
Forio d'Ischia	13,06	5461	33	0	0	Rischio frana 487 (0) Rischio idr. 45 (3)	933 (0)	0	3

(1) Rilievi a cura del Dipartimento della Protezione civile nella prima fase dell'emergenza

(2) Ordinanza sindacale

(3) Dati estrapolati dal rilievo dell'agibilità e censimento del danno (Schede AeDES)

(4) Con SCIA o CILA

(5) Dati forniti dai Comuni – in elaborazione

Per "edificio" si intende una struttura omogenea cielo-terra che può contenere da 1 a più unità abitative

Tabella 1.2.1

1.3 Primi interventi di riparazione degli immobili danneggiati

Nel corso del tempo, prevalentemente per i casi di edifici che presentavano danni modesti per entità e diffusione, ovvero ascrivibili a circostanze esterne al fabbricato e/o a situazioni contingenti, per le quali questo Commissariato ha effettuato un monitoraggio e compulsato i comuni alla risoluzione delle problematiche, le ordinanze di sgombero sono state revocate a seguito di interventi di riparazione o ripristino, avviati con le procedure Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) o Cila (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e attestati con perizia del tecnico incaricato e verificati dai Comuni. Al momento, complessivamente risultano revocate circa n. 180 ordinanze di sgombero (**Allegato 1A**).

Le spese per gli interventi di cui sopra sono state sostenute direttamente dai proprietari, accedendo in alcuni casi agli sgravi fiscali per ristrutturazione previsti per legge o al cosiddetto "Sisma-Bonus", misure queste che a differenza dei contributi per la ricostruzione di cui al D.L. 109/2018 e s.m.i, prescindono dall'esitazione delle procedure di condono.

A titolo indicativo si allega un report fotografico relativo ad alcuni dei suddetti interventi (**Allegato 1B**).



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

1.4 Monitoraggio attività ex art. 25 (Condonò)

Relativamente al monitoraggio dei condoni pendenti sugli edifici inagibili, si dispone di dati parziali, in quanto solo il Comune di Lacco Ameno ha comunicato per ogni edificio inagibile l'esistenza o meno di condoni pendenti; il Comune di Casamicciola, invece, comunica di volta in volta il numero di pratiche in esame, riferendo di difficoltà oggettive legate alla mole degli atti e alla logistica in considerazione del fatto che gli archivi sono siti presso la sede Comunale resa inagibile dal terremoto, lo stesso per il Comune di Forio.

Nel dettaglio, dal monitoraggio delle attività per il condono, si rileva quanto segue:

Comune di Casamicciola Terme

- n. 18 pratiche esitate con parere favorevole dalla Soprintendenza (di cui 2 con esito A);
- n. 5 pratiche con avviso di diniego (di cui 1 con esito A);
- n. 23 pratiche hanno beneficiato del silenzio-assenso (di cui 7 con esito A);
- n. 5 pratiche inoltrate alla Soprintendenza in attesa di parere;
- n. 86 pratiche all'esame della Commissione paesaggistica del Comune;
- n. 11 rilasci di permessi a Costruire in Sanatoria (di cui 6 con esito A).

Comune di Lacco Ameno

- n. 9 pratiche esitate con parere favorevole dalla Soprintendenza;
- n. 2 pratica con avviso di diniego;
- n. 13 pratiche hanno beneficiato del silenzio-assenso;
- n. 3 pratiche inoltrate alla Soprintendenza in attesa di parere;
- n. 1 pratiche all'esame della Commissione paesaggistica del Comune;
- n. 9 rilasci di permessi a Costruire in Sanatoria.

Comune di Forio

- n. 1 pratiche esitate con parere favorevole dalla Soprintendenza;
- n. 0 pratiche con avviso di diniego;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- n. 3 pratiche hanno beneficiato del silenzio-assenso (in attesa di determinazione degli oneri);
- n. 0 pratiche inoltrate alla Soprintendenza in attesa di parere;
- n. 1 pratiche all'esame della Commissione paesaggistica del Comune;
- n. 0 rilasci di permessi a Costruire in Sanatoria.

1.5 Attuazione OCDPC 587/2019

Relativamente all'attività ereditata dal cessato Commissario Delegato che prevedevano interventi, questo Commissariato sta sostenendo per intero l'istruttoria per il trasferimento dei fondi, ma anche il completamento degli interventi stessi, alcuni dei quali mai avviati al momento del trasferimento delle competenze.

In allegato si riportano relazioni di sintesi distinte per Interventi di somma urgenza, interventi urgenti e interventi urgenti sui BB.CC. (**Allegati 2, 3, e 4**).

1.6 Ricostruzione privata

Relativamente alla ricostruzione privata, si riporta **nell'allegato 5** una breve sintesi delle attività in corso.

1.7 Ricostruzione pubblica - scuole

Relativamente alla ricostruzione pubblica, si riporta **nell'allegato 6** una breve sintesi delle attività in corso relativamente agli interventi di recupero degli edifici scolastici danneggiati dal sisma.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. ALLEGATO 1A – IMMOBILI PER I QUALI È STATA RIPRISTINATA L'AGIBILITÀ CON PERIZIA TECNICA

Comune	Istanza		Esito Scheda AeDES	Richiedente	Indirizzo	Interventi eseguiti		Perizia			Ordinanza di revoca di inagibilità		Documentazione fotografica (ante e post intervento)
	N.ro	Data				Titolo edilizio (Cila, Scia, etc)	Tipologia di intervento (eventuale sismabonus e/o altro contributo)	N.ro	Data	Esito	N.ro	Data	
Casamicciola Terme	489	24/08/2017	E	XXXXX	Piazza Dottor Verde, xx					Revoca	564	13/07/2018	
Casamicciola Terme	1070	28/08/2017	E	XXXXX	Il Vicoletto Delle Scuole, xx	CILA n.2128 del 02/02/2018	Spicconatura del fabbricato, demolizione delle tramezzature e della cassa scale. Posa di fibra di vetro e di mala cementizia. Ricostruzione delle tramezzature e della cassa scale	12297	30/07/18	Revoca	574	01/08/2018	
Casamicciola Terme	1070	28/08/2017	E	XXXXX	Il Vicoletto Delle Scuole, xx	CILA n.2128 del 02/02/2018	Spicconatura del fabbricato, demolizione delle tramezzature e della cassa scale. Posa di fibra di vetro e di mala cementizia. Ricostruzione delle tramezzature e della cassa scale	12297	30/07/18	Revoca	575	01/08/2018	
Casamicciola Terme	1070	28/08/2017	E	XXXXX	Il Vicoletto Delle Scuole, xx	CILA n.2128 del 02/02/2018	Spicconatura del fabbricato, demolizione delle tramezzature e della cassa scale. Posa di fibra di vetro e di mala cementizia. Ricostruzione delle tramezzature e della cassa scale	12297	30/07/18	Revoca	576	01/08/2018	
Casamicciola Terme	1070	28/08/2017	E	XXXXX	Il Vicoletto Delle Scuole, xx	CILA n.2128 del 02/02/2018	Spicconatura del fabbricato, demolizione delle tramezzature e della cassa scale. Posa di fibra di vetro e di mala cementizia. Ricostruzione delle tramezzature e della cassa scale	12297	30/07/18	Revoca	577	01/08/2018	
Casamicciola Terme			E-F	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx			10023	14/06/18	Revoca	579	02/08/2018	
Casamicciola Terme	1281	01/09/2017	C	XXXXX	Piccola Sentinella, xx	CILA 5568 del 13/03/2018	riparazione tramezzature interne e della canna fumaria	9538	06/06/18	Revoca	655	28/09/2018	
Casamicciola Terme	10582	15/09/2017	B	XXXXX	Corso Garibaldi, xx	SCIA 5111 del 05/03/2018	rifacimento intonaci, rifacimento copriferro, finiture facciate, pavimentazioni.	12890	14/08/18	Revoca	656	28/09/2018	
Casamicciola Terme	11100	20/09/2017	B	XXXXX	Piazza Bagni, xx	CILA 13523 del 31/08/2018		14355	19/09/18	Revoca	657	28/09/2018	
Casamicciola Terme	VF05	23/08/2017	B	XXXXX	Viale Paradisiello, xx	CIL 8627 del 18/05/2018		13570	03/09/18	Revoca	663	11/10/2018	
Casamicciola Terme	414	24/08/2017	B	XXXXX	Calata Sant'Antonio, xx	CIL 12626 del 13/10/2017	Riparazione e rifacimento pavimentazione interna, sostituzione infissi e serramenti interni, sostituzione apparecchi sanitari, riparazione terrazzi e balconi, ripristino tinteggiatura	9625	07/05/18	Revoca	665	11/10/2018	
Casamicciola Terme	1447	09/09/2017	B	XXXXX	Principe Tommaso, xx	CILA 5373 del 08/03/2018	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	11692	16/07/18	Revoca	666	11/10/2018	X
Casamicciola Terme	13476	07/11/2017	B	XXXXX	Parodi, xx	CIL 10968 del 19/09/2017	lavori di manutenzione ordinaria	7658	26/04/18	Revoca	691	16/11/2018	
Casamicciola Terme	13476	07/11/2017	B	XXXXX	Parodi, xx	CIL 10968 del 19/09/2017	lavori di manutenzione ordinaria	9411	04/06/18	Revoca	692	16/11/2018	
Casamicciola Terme	716	25/08/2017	E	XXXXX	Ombrasco, xx	SCIA 10232 del 19/06/2018	Interventi di miglioramento sismico con ricorso alle agevolazione del Sismabonus 2018	15744	24/10/18	Revoca	725	14/12/2018	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, consistenti nella rimozione della	15813	25/10/18	Revoca	726	14/12/2018	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Principessa Margherita, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, consistenti nella rimozione della	15813	25/10/18	Revoca	727	14/12/2018	
Casamicciola Terme	1215	30/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx	CILA 6912 del 11/04/2018	Spicconatura intonaci , rimozione tramezzature danneggiate, rimozione pavimentazione, rifacimento impianti elettrico ed idraulico, sostituzione infissi.	11973	20/07/18	Revoca	728	14/12/2018	
Casamicciola Terme	525	24/08/2017	B	XXXXX	Iasolino, xx	CIL 9136 del 29/05/2018	riparazione tramezzature danneggiate, riparazione rifiniture e pitturazione.	9741	08/06/19	Revoca	729	14/12/2018	
Casamicciola Terme	12691	17/10/2017	B-F	XXXXX	Pantano, xx	SCIA 1832 del 30/01/2018	opere di contenimento e sistemazione abbozzo e intonaco e lievi lesioni.	6664	05/04/18	Revoca	730	14/12/2018	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, consistenti nella rimozione della	15814	25/10/18	Revoca	731	14/12/2018	
Casamicciola Terme	262	23/08/2017	B	XXXXX	Cretaio, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, consistenti in opere di	9875	12/06/18	Revoca	732	14/12/2018	
Casamicciola Terme	555	24/08/2017	B-F	XXXXX	Viale Paradisiello, xx	CILA 8826 del 23/05/2018	abbozzo dell'intonaco e tinteggiatura	10182	18/06/18	Revoca	733	14/12/2018	
Casamicciola Terme			A-F	XXXXX	Vincenzo Mancuso		rimozione del danno incombente dettato dalla canna fumaria	15814	25/10/18	Revoca	734	14/12/2018	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, consistenti in opere di	16449	12/11/18	Revoca	735	14/12/2018	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, consistenti in opere di	15812	25/10/18	Revoca	736	14/12/2018	
Casamicciola Terme	784	25/08/2017	B	XXXXX	Il Traversa Sanfelice, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, opere di manutenzione ordinaria (riparazione danni leggeri alle tramezzature e alla tamponature).	17898	12/12/18	Revoca	737	14/12/2018	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, opere di manutenzione ordinaria (risanamento intonaci e rifacimento pitture).	17992	13/12/18	Revoca	743	24/12/2018	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, opere di manutenzione ordinaria (risanamento intonaci e rifacimento pitture).	17993	13/12/18	Revoca	744	24/12/2018	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, opere di manutenzione ordinaria (risanamento intonaci e rifacimento pitture).	17996	13/12/18	Revoca	745	24/12/2018	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, opere di manutenzione ordinaria (risanamento intonaci e rifacimento pitture).	14126	13/09/18	Revoca	746	24/12/2018	
Casamicciola Terme	1304	01/09/2017	B	XXXXX	Castanito, xx	CILA 6353 del 28/03/2018	rinforzo della muratura, stonacatura delle pareti interne e scarnitura dei giunti,posizionamento della rete porta intonaco, abbozzo con inerte,	113	04/01/19	Revoca	13	16/01/2019	
Casamicciola Terme	13476	07/11/2017	B	XXXXX	Parodi, xx	CILA 1376 del 18/01/2018	opere di ordinaria manutenzione	17381	30/11/18	Revoca	14	16/01/2019	

Casamicciola Terme	13476	07/11/2017	B	XXXXX	Parodi, xx	CILA 1376 del 18/01/2018	opere di ordinaria manutenzione	17379	30/11/18	Revoca	15	16/01/2019	
Casamicciola Terme	1215	30/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	17838	11/12/18	Revoca	16	16/01/2019	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		opere di ordinaria manutenzione	14132	13/09/18	Revoca	43	29/01/2019	
Casamicciola Terme	5007		A-F	XXXXX	Tresta, xx	CILA 11854 del 18/07/2018	demolizione piccolo rudere, riparazione canna fumaria	13584	03/09/18	Revoca	56	13/02/2019	
Casamicciola Terme	5007		A-F	XXXXX	Tresta, xx	CILA 11855 del 18/07/2018	demolizione piccolo rudere, riparazione canna fumaria	1377	31/01/19	Revoca	57	13/02/2019	
Casamicciola Terme	1355	03/09/2017	E	XXXXX	Viale Paradisiello, xx	CILA 17915 del 12/12/2018	opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	797	21/01/19	Revoca	58	13/02/2019	
Casamicciola Terme	840	28/08/2017	A-F	XXXXX	Cretaio, xx	CILA 13898 del 10/09/2018	rifacimento muro	1284	30/01/19	Revoca	59	12/02/2019	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Roma, xx	CILA 15131 del 09/10/2018	riparazione tramezzature danneggiate, riparazione rifiniture e pitturazione.	17514	04/12/18	Revoca	61	19/02/2019	
Casamicciola Terme	1321	01/09/2017	C	XXXXX	Monte Della Misericordia, xx	SCIA 10071 del 08/09/2017	risanamento conservativo muri perimetrali , rafforzamento archi. Rafforzamento setti murari.	1752	11/02/19	Revoca	68	27/02/2019	
Casamicciola Terme	1355	03/09/2017		XXXXX	Viale Paradisiello, xx					Revoca	79	27/02/2019	
Casamicciola Terme	583	22/08/2017	E	XXXXX	Cagliari, xx	CIL 2669 del 12/02/2018	posa di intonaci armati, di fasce o cordolature, catene e rinforzi cantonali	1950	14/02/19	Revoca	97	05/03/2019	
Casamicciola Terme	583	22/08/2017	E	XXXXX	Cagliari, xx	SCIA 2667 del 12/02/2018	realizzazione di telai in acciaio, di intonaci armati, catene e rinforzi cantonali	1948	14/02/19	Revoca	98	05/03/2019	
Casamicciola Terme	583	22/08/2017	E	XXXXX	Cagliari, xx	CIL 2668 del 12/02/2018	realizzazione di telai in acciaio, di intonaci armati, catene e rinforzi cantonali	1945	14/02/19	Revoca	99	05/03/2019	
Casamicciola Terme	583	22/08/2017	E	XXXXX	Cagliari, xx	SCIA 2667 del 12/02/2018	realizzazione di telai in acciaio, di intonaci armati, catene e rinforzi cantonali	1943	14/02/19	Revoca	100	05/03/2019	
Casamicciola Terme			E	XXXXX	Viale Paradisiello, xx	SCIA 9044 del 20/05/2018	rifacimento intonaci e tramezzi	2971	07/03/19	Revoca	107	14/03/2019	
Casamicciola Terme			E	XXXXX	Piazza Bagni, xx	CILA 7135 del 16/04/2018 e SCIA 16815 del 16/11/2018	Spicconatura abbozzo e intonaco, rifacimento pavimenti, realizzazione impianto elettrico e idraulico.	3280	13/03/19	Revoca	108	14/03/2019	
Casamicciola Terme	1293	01/09/2017	E	XXXXX	Tommaso Morgera, xx	SCIA 3017 del 18/02/2018	ripristino parapetto, risanamento muri perimetrali, rafforzamento setti murari, rafforzamento piattabande, sarcitura lesioni.	3116	12/03/19	Revoca	129	25/03/2019	
Casamicciola Terme	547	23/08/2017	B	XXXXX	Iasolino, xx	CILA 16452 del 12/11/2018	riparazione parapetto, delle tramezzature, delle rifiniture, pitturazione.	3750	21/03/19	Revoca	134	28/03/2019	
Casamicciola Terme	860	26/08/2017	E-F	XXXXX	Piazza Maio, xx	CILA 9986 del 13/06/2018	puntellatura e sbadacchiatura dei maschi murari.	10238	19/05/19	Revoca	135	28/03/2019	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Elena, xx	CIL 15740 del 24/10/2018	opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	3093	11/03/19	Revoca	136	28/03/2019	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	3084	11/03/19	Revoca	137	28/03/2019	
Casamicciola Terme	13476	07/11/2017	B	XXXXX	Parodi, xx	CIL10966 del 19/09/2017	opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	16242	07/11/18	Revoca	138	28/03/2019	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Canata Sant'Antonio, xx	CIL 9249 del 31/05/2018	Spicconatura intonaco e abbozzo.	12089	24/07/18	Revoca	139	28/03/2019	
Casamicciola Terme	1293	01/09/2017		XXXXX	Tommaso Morgera, xx					Revoca	141	28/03/2019	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx	CILA 7511 del 23/04/2018	ammorsamento tramezzature, riparazione tramezzature, riparazione rifiniture, pitturazione.	7969	04/05/18	Revoca	142	28/03/2019	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx	CILA 7509 del 23/04/2018	ammorsamento tramezzature, riparazione tramezzature, riparazione rifiniture, pitturazione.	7970	04/05/18	Revoca	143	28/03/2019	
Casamicciola Terme	1394bis	04/09/2017	B	XXXXX	Cumana, xx		rifacimento abbozzo e intonaci	3810	22/03/19	Revoca	185	18/04/2019	
Casamicciola Terme	1394bis	04/09/2017	B	XXXXX	Cumana, xx		rifacimento abbozzo e intonaci	3809	22/03/19	Revoca	186	18/04/2019	
Casamicciola Terme	1394bis	04/09/2017	B	XXXXX	Cumana, xx		rifacimento abbozzo e intonaci	3811	22/03/19	Revoca	187	18/04/2019	
Casamicciola Terme	582	22/08/2017	E	XXXXX	Castanito, xx	CIL 12230 del 26/07/2018	riparazione e rifacimento tramezzature e intonaci	4038	27/03/19	Revoca	192	26/04/2019	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Guglielmo Sanfelice, xx	SCIA 6723 del 06/04/2018	opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	4914	11/04/19	Revoca	193	26/04/2019	
Casamicciola Terme	14734	07/12/2017	B	XXXXX	Arenale, xx	CILA 16130 del 05/11/2018	opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	3720	21/03/19	Revoca	196	26/04/2019	
Casamicciola Terme	582	22/08/2017	E	XXXXX	Castanito, xx	CIL 12230 del 26/07/2018	opere di manutenzione straordinaria	4038	27/03/19	Revoca	197	26/04/2018	
Casamicciola Terme	11355	22/09/2017	E-F	XXXXX	Epomeo, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, opere di manutenzione ordinaria (ripristino intonaci).	13834	06/09/18	Revoca	206	09/05/2019	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Principessa Margherita, xx	CIL 2378 del 07/02/2018	consolidamento muratura di tufo con iniezioni di cemento armato.	5822	07/05/19	Revoca	209	14/05/2019	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, consistenti nella rimozione della	15889	29/10/18	Revoca	210	14/05/2019	
Casamicciola Terme	1190quater	30/08/2017	E	XXXXX	Castanito, xx	CILA 13953 del 17/11/2019	rimozione delle lesioni agli intonaci, riparazione pagoda.	5274	18/04/19	Revoca	211	14/05/2019	
Casamicciola Terme			C	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx	CILA 12559 del 06/09/2018	rimozione intonaco, ripristino muratura degradata, demolizione tramezzatura sottoscala, rimozione pedate, ripristino calcestruzzo ammalorato	5468	26/04/19	Revoca	232	13/06/2019	
Casamicciola Terme			C	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx	CILA 10233 del 19/06/2018	Demolizione tramezzi, rimozione intonaco, posa fibra di vetro, rifacimento impianto elettrico ed idraulico	12256	27/07/18	Revoca	233	13/06/2019	
Casamicciola Terme	1181	30/08/2017	B-F	XXXXX	Lampugnani, xx			4973	12/04/19	Revoca	234	13/06/2019	
Casamicciola Terme	1116	30/08/2017	B	XXXXX	Dottor Mennella, xx		opere di manutenzione ordinaria non necessitanti di titolo abilitativo o denuncia inizio lavori, consistenti nell'eliminazione delle lesioni agli intonaci.	5010	12/04/19	Revoca	235	13/06/2019	
Casamicciola Terme	565	24/08/2017	B	XXXXX	Amedeo di Savoia, xx	SCIA 6181 del 23/03/2018	Eliminazione degli intonaci e verifica dello stato fessurativo.	15925	29/10/18	Revoca scheda 239	236	13/06/2019	
Casamicciola Terme	565	24/08/2017	B	XXXXX	Amedeo di Savoia, xx	SCIA 6181 del 23/03/2018	Eliminazione degli intonaci e verifica dello stato fessurativo.	15926	29/10/18	Revoca scheda 239	237	13/06/2019	
Casamicciola Terme	703	25/08/2017	A-F	XXXXX	Piccola Sentinella, xx		LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO VIA PICCOLA SENTINELLA			Revoca	238	13/06/2019	
Casamicciola Terme	1280		E	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx	SCIA 542 del 16/01/2018	Ripristino zone danneggiate, eliminazione delle spinte orizzontali, collegamento pannelli murari, riduzione della aperture di elevate dimensioni.	6807	31/05/19	Revoca	240	13/06/2019	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Cagliari, xx	CILA 10621 del 26/06/2018	riparazione tramezzature e tamponature	7814	25/06/19	Revoca	264	03/07/2019	
Casamicciola Terme	11209	21/09/2017	B	XXXXX	Pennino, xx		riparazione tramponature e tramezzi	6250	16/05/19	Revoca	265	03/07/2019	
Casamicciola Terme	1320		E	XXXXX	Iasolino, xx	CIL 16896 del 20/11/2018	interventi di manutenzione ordinaria	7919	27/06/19	Revoca	268	11/07/2019	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Corso Luigi Manzi, xx	CIL 7261 del 11/06/2019	rimozione piastrelle, riparazione tramezzature.	7734	21/06/19	Revoca	269	11/07/2019	
Casamicciola Terme	742	25/08/2017	B-F	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx	CIL 1354 del 31/01/2019	riparazione tramezzature.	8088	02/07/19	Revoca	270	11/07/2019	
Casamicciola Terme	11193	21/09/2017	E	XXXXX	Cumana, xx	CILA4916 del 11/04/2019	spicconatura abbozzo, rifacimento tramezzi, rifacimento giunti.	5592	30/04/19	Revoca	271	11/07/2019	

Casamicciola Terme	525	24/08/2017	B	XXXXX	Iasolino, xx	CILA 11327 del 09/07/2018	riparazione infissi, pitturazione.	7308	13/06/19	Revoca	272	11/07/2019	
Casamicciola Terme	603	24/08/2017	B	XXXXX	Piccola Sentinella, xx	CIL 14191 del 23/11/2017	ripristino intonaci e abbozzi	13829	06/09/18	Revoca scheda 950	293	18/07/2019	
Casamicciola Terme	603	24/08/2017	B	XXXXX	Piccola Sentinella, xx	CIL 14192 del 23/11/2017	ripristino intonaci	13830	06/09/18	Revoca scheda 950	294	18/07/2019	
Casamicciola Terme			A-F	XXXXX	Ottiringolo, xx			10604	25/05/18	Revoca scheda 1720	295	18/07/2019	
Casamicciola Terme	742	25/08/2017	A-F	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx			14213	23/11/17	Revoca scheda 503 e 1211	296	18/07/2019	
Casamicciola Terme			B-F	XXXXX	Corso Garibaldi, xx	SCIA 2488 del 21/08/2017	ripristino lesioni, nei soli e nell'intonaco.	8001	28/06/19	Revoca	297	18/07/2019	
Casamicciola Terme	1176ter	23/08/2017	E-F	XXXXX	Epomeo, xx	CILA 873 del 22/01/2019	riparazione intonaci e tramezzi	2059	18/02/19	Revoca	298	18/07/2019	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Castanito, xx			8649	16/07/19	Revoca scheda 255 e 650	299	18/07/2019	
Casamicciola Terme	10651/4	04/09/2017	B	XXXXX	Via Piccola Sentinella, xx	CILA 85258 del 07/03/2018	posa in opera di pavimentazione, controsoffitto, opere impiantistiche, risanamento	9760	08/06/18	Revoca scheda 1765 e 1768	300	01/08/2019	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Il Vicoletto Delle Scuole, xx	CIL 8264 del 15/07/2019	riparazione intonaci e tramezzi	8953	24/07/19	Revoca	301	01/08/2019	
Casamicciola Terme			C	XXXXX	Piazza Maio, xx	CILA 14956 del 04/10/2018	scarnitura connessure, bavaggio e depolverizzazione muri, sigillatura giunti, esecuzione reticolo costituito da 5 iniettori con sistema di fiocco per ogni mq, iniezioni di boiacca di cemento, applicazione fibra di acciaio	2991	08/03/19	Revoca scheda 937	302	01/08/2019	
Casamicciola Terme	742	25/08/2017	B-F	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx			8668	16/07/19	Revoca	303	01/08/2019	
Casamicciola Terme	517	24/08/2017	E	XXXXX	Castanito, xx	SCIA 14813 del 02/10/2018	consolidamento pilastri, ripresa ammorsamenti di nodi murari, sarcitura lesioni, rafforzamento scala esterna, spicconatura, rimozione rivestimenti, realizzazione intonaci.	8813	19/07/19	Revoca	304	01/08/2019	
Casamicciola Terme	516	24/08/2017	E	XXXXX	Castanito, xx	SCIA 14813 del 02/10/2018	consolidamento pilastri, ripresa ammorsamenti di nodi murari, sarcitura lesioni, rafforzamento scala esterna, spicconatura, rimozione rivestimenti, realizzazione intonaci.	8812	19/07/19	Revoca	305	01/08/2019	
Casamicciola Terme	742	25/08/2017	B-F	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx	CILA 10205 del 18/06/2018	manutenzione ordinaria	9170	30/07/19	Revoca	320	28/08/2019	
Casamicciola Terme	742	25/08/2017	B-F	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx	CILA 10207 del 18/06/2018	manutenzione ordinaria	9168	30/07/19	Revoca	321	28/08/2019	
Casamicciola Terme	742	25/08/2017	B-F	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx	CILA 6150 del 22/03/2018	manutenzione ordinaria	10042	27/08/19	Revoca	337	29/08/2019	
Casamicciola Terme	742	25/08/2017	B-F	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx	CILA 10206 del 18/06/2018	riparazione intonaci	9169	30/07/19	Revoca scheda 474	338	29/08/2019	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		rimozione canna fumaria	15962	30/10/18	Revoca	346	05/09/2019	
Casamicciola Terme			C	XXXXX	Principessa Margherita, xx	SCIA 15234 del 12/10/2018 e SCIA 194 del 07/01/2019	rimozione abbozzo e intonaco, sostituzione ferri nei tralici e nel legno, pulizia tufo, realizzazione traliccio metallico.	9964	23/08/19	Revoca	359	05/09/2019	
Casamicciola Terme	1063	28/08/2017	B-F	XXXXX	Montecito, xx	CIL 5964 del 09/05/2019	manutenzione ordinaria	9764	20/08/19	Revoca	387	01/10/2019	
Casamicciola Terme	464	24/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		rimozione canna fumaria	15890	29/10/18	Revoca	388	01/10/2019	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx		puntellamento e opere provvisori	10942	20/09/19	Revoca scheda 682	407	17/10/2019	
Casamicciola Terme	1175		E-F	XXXXX	Epomeo, xx		LAVORI DI SOMMA URGENZA VIA EPOMEIO	8738	18/07/19	Revoca	410	17/10/2019	
Casamicciola Terme	406		E	XXXXX	Castanito, xx	SCIA 13816 del 06/09/2018	opere strutturali con deposito al Genio Civile	11861	11/01/19	Revoca	427	23/10/2019	
Casamicciola Terme	1279	12/09/2017	A-F	XXXXX	Amedeo di Savoia, xx			10627	12/09/19	Revoca	436	25/10/2019	
Casamicciola Terme	423	24/08/2017	E-F	XXXXX	Cittadini, xx	SCIA 11977 del 20/07/2018	opere strutturali con deposito al Genio Civile	11745	09/10/19	Revoca	437	25/10/2019	
Casamicciola Terme	423	24/08/2017	E-F	XXXXX	Cittadini, xx	SCIA 11977 del 20/07/2018	opere strutturali con deposito al Genio Civile	11746	09/10/19	Revoca	438	25/10/2019	
Casamicciola Terme	423	24/08/2017	E-F	XXXXX	Cittadini, xx	SCIA 11977 del 20/07/2018	opere strutturali con deposito al Genio Civile	11747	09/10/19	Revoca	439	25/10/2019	
Casamicciola Terme	742	25/08/2017	B-F	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx	CILA del 05/10/2018	riparazione tramezzature, riparazione rifiniture e pitturazione superfici	15253	12/10/18	Revoca	440	29/10/2019	
Casamicciola Terme	423	24/08/2017	E-F	XXXXX	Cittadini, xx	SCIA 11977 del 20/07/2018	opere strutturali con deposito al Genio Civile	12302	18/10/19	Revoca	441	29/10/2019	
Casamicciola Terme	610		B	XXXXX	Corso Luigi Manzi, xx	CIL 9644 del 07/08/2018	opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	4990	12/04/19	Revoca scheda 271	499	26/11/2019	
Casamicciola Terme	1467	11/09/2017	B	XXXXX	Iasolino, xx			11960	15/10/19	Revoca	517	03/12/2019	
Casamicciola Terme	1320		E	XXXXX	Iasolino, xx	CIL 14954 del 14/12/2017	riparazione intonaci	8633	18/05/18	Revoca	518	03/12/2019	
Casamicciola Terme	1215	30/08/2017	B	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx	CILA 6912 del 11/04/2018	spicconatura abbozzo, rimozione tramezzature danneggiate, ristilatura parziale dei giunti	12612	23/10/19	Revoca	519	03/12/2019	
Casamicciola Terme			E	XXXXX	Santa Barbara,xx	CILA 13461 del 07/11/2019	rimozioni e ripristino intonaci	14004	20/11/19	Revoca	520	03/12/2019	
Casamicciola Terme			E	XXXXX	XX	CILA 15465 del 27/12/2017	applicazione fibra di vetro, rimozione intonaci, demolizione e rifacimento tramezzature.	6138	22/03/18	Revoca	3	16/01/2020	
Casamicciola Terme			E	XXXXX	XX	SCIA 12024 del 26/06/2018	abbattimento e ricostruzione solai, sostituzione piattabande, cucì e scuci murature, tinteggiatura, rimozione rivestimenti, spicconatura intonaco, stilatura e rinzafo dei giunti.	10608	26/06/18	Revoca	4	16/01/2020	
Casamicciola Terme	13476	07/11/2017	B	XXXXX	Parodi, xx	CIL 5835 del 18/03/2018	stuccatura e pitturazione	14281	18/09/18	Revoca	5	16/01/2020	
Casamicciola Terme	13476	07/11/2017	B	XXXXX	Parodi, xx	CIL 5835 del 18/03/2018	stuccatura e pitturazione	14281	18/09/18	Revoca	6	16/01/2020	
Casamicciola Terme	1175bis		E-F	XXXXX	Epomeo, xx	CILA 14163 del 24/11/2019 – SU Via Epomeo	tinteggiatura e opere di finitura	15433	23/12/19	Revoca	9	16/01/2020	
Casamicciola Terme	197	23/08/2017	B	XXXXX	Viale Paradisiello, xx	CIL 2028 del 01/02/2018	posa di malta idraulica e rete di fibra di basalto.	14629	04/12/19	Revoca	10	16/01/2020	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Principessa Margherita, xx	CIL 8834 del 23/05/2018	rimozione parapetto,rimozione parte lesionata canna fumaria.	9620	07/06/18	Revoca scheda 552	11	16/01/2020	
Casamicciola Terme	742	25/08/2017	B-F	XXXXX	Rampe Paradisiello, xx	CIL 1354 del 31/01/2019	riparazione tramezzature,installazione di rete geo grid, riparazione rifiniture, pitturazione.	13082	30/10/19	Revoca scheda 474	12	16/01/2020	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Arenale, xx	CIL 14626 del 04/12/2019	rimozione copriferro ammalorato, ripristino battiscopa.	278	10/01/20	Revoca	24	28/01/2020	
Casamicciola Terme			E	XXXXX	Corso Vittorio Emanuele, xx	CILA 12489 del 22/10/2019	refacimento dei tramezzi e degli intonaci dei rivestimenti, degli impianti, degli infissi e dei serramenti.	205		Revoca	25	28/01/2020	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Cretaio, xx	SCIA 15154 del 16/12/2019	Abbozzo , intonaco, e tinteggiature	1263	04/02/20	Revoca	37	28/02/2020	
Casamicciola Terme			B	XXXXX	Ombrasco, xx	SCIA 15161 del 16/12/2019	Abbozzo , intonaco, e tinteggiature	1262	04/02/20	Revoca	38	28/02/2020	
Casamicciola Terme	1090	28/08/2017	B	XXXXX	Corso Luigi Manzi, xx	SCIA 15228 del 17/12/2019	rimozione intonaco, posa di malta, applicazione spatola metallica di adesivo epossidico bicomponente.	1265	04/02/20	Revoca	39	28/02/2020	
Casamicciola Terme			E-F	XXXXX	Cognole, xx	CIL1415 del 07/02/2020	puntellamento muro esterno	2130	25/02/20	Revoca	40	28/02/2020	
Casamicciola Terme	487	24/08/2017	B	XXXXX	Piazzetta Funno, xx	DIA 13180 del 27/10/2017	montaggio di cerchiatura metallica, ripristino giunti, cucì e scuci.	11431	10/07/18	Revoca	41	28/02/2020	
Casamicciola Terme	864	26/08/2017	A-F	XXXXX	Arenale, xx			1187	03/02/20	Revoca	42	28/02/2020	

Lacco Ameno

Comune	Istanza		Esito Scheda AeDES	Richiedente	Indirizzo	Titolo edilizio (Cila, Scia, etc)	Perizia			Ordinanza di revoca di inagibilità		Documentazione fotografica (ante e post intervento)
	N.ro	Data					N.ro	Data	Esito	N.ro	Data	
Lacco Ameno	9724	03/09/2017	A-F	XXXXX	VIA VINCENZO MORGERA, xx		1217	03/09/2017	Revoca	139	07/12/2017	
Lacco Ameno	9912	28/08/2017	C	XXXXX	VIA CRISTOFORO COLOMBO, xx		1811	05/02/18	Revoca	290	12/02/2018	
Lacco Ameno	9739	26/08/2017	B	XXXXX	VIA CRATECA, xx		2191	13/02/18	Revoca	291	15/02/2018	
Lacco Ameno	9522	25/08/2017	B	XXXXX	VIA CRATECA, xx	CIL CON NOMINA TECNICO	2546	19/02/18	Revoca	301	23/02/2018	X
Lacco Ameno	9784	03/09/2017	C	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		2525	19/02/18	Revoca	300	23/02/2018	
Lacco Ameno	10109	03/09/2017	C	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		2525	19/02/18	Revoca	300	23/02/2018	
Lacco Ameno	10241	03/09/2017	C	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		2525	19/02/18	Revoca	300	23/02/2018	
Lacco Ameno	10242	03/09/2017	C	XXXXX	VIA CRISTOFARO COLOMBO, xx		2525	19/02/18	Revoca	300	23/02/2018	
Lacco Ameno	9613BIS*	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		3626	09/03/18	Revoca	308	14/03/2018	
Lacco Ameno	9845	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		3627	09/03/18	Revoca	309	14/03/2018	
Lacco Ameno	9630	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		3698	12/03/18	Revoca	332	22/03/2018	
Lacco Ameno	9613TRIS*	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		3697	12/03/18	Revoca	329	22/03/2018	
Lacco Ameno	9613QUATER*	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		3763	13/03/18	Revoca	331	22/03/2018	
Lacco Ameno	9950	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		3762	13/03/18	Revoca	330	22/03/2018	
Lacco Ameno	9809	29/08/2017	B	XXXXX	VIA SAN ROCCO, xx		4349	23/03/18	Revoca	334	26/03/2018	
Lacco Ameno	547	26/08/2017	B	XXXXX	VIA IASOLINO, xx				Revoca	134	28/03/2018	
Lacco Ameno	10352	09/09/2017	B	XXXXX	VIA BORBONICA, xx		3931	16/03/18	Revoca	338	10/04/2018	
Lacco Ameno	9666	02/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA ZONA 167		4369	26/03/18	Revoca	337	10/04/2018	
Lacco Ameno	9846	02/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA ZONA 167		4369	26/03/18	Revoca	337	10/04/2018	
Lacco Ameno	9847	02/09/2017	B	XXXXX	Via Pannella (Zona 167 -Fabbricato "e"-		4369	26/03/18	Revoca	337	10/04/2018	
Lacco Ameno	9909	02/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		4369	26/03/18	Revoca	337	10/04/2018	
Lacco Ameno	9923	02/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA ZONA 167		4369	26/03/18	Revoca	337	10/04/2018	
Lacco Ameno	10069	02/09/2017	B	XXXXX			4369	26/03/18	Revoca	337	10/04/2018	
Lacco Ameno	9737BIS	11/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		4241	22/03/18	Revoca	341	16/04/2018	
Lacco Ameno	10713tris*	23/09/2017	C	XXXXX	Via Circumvalazione		5045	10/04/18	Revoca	347	16/04/2018	
Lacco Ameno	9750	01/09/2017	C	XXXXX	VIA ROSARIO, xx		5231	12/04/18	Revoca	346	16/04/2018	
Lacco Ameno	9732	31/08/2017	B-F	XXXXX	VIA VICINALE PANNELLA, xx		5162	11/07/18	Revoca	342	16/04/2018	
Lacco Ameno	9701	11/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		4708	03/04/18	Revoca	340	16/04/2018	
Lacco Ameno	12560	28/11/2017	B	XXXXX	PANNELLA, xx		5453	17/04/18	Revoca	348	23/04/2018	
Lacco Ameno	10289BIS	08/09/2017	B	XXXXX	VIA FUNDERA, xx		7555	04/06/18	Revoca	362	15/06/2018	
Lacco Ameno	10441	12/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		7874	08/06/18	Revoca	360	15/06/2018	
Lacco Ameno	9652	13/09/2017	B	XXXXX	Via Oneso, xx		9126	06/07/18	Revoca	365	12/07/2018	
Lacco Ameno	9732BIS*	31/08/2017	B-F	XXXXX	VIA VICINALE PANNELLA, xx		9408	11/07/18	Revoca	366	23/07/2018	
Lacco Ameno	10713BIS*	23/09/2017	C	XXXXX	Via Circumvalazione		9753	19/07/18	Revoca	367	27/07/2018	
Lacco Ameno	9561	30/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		9840	20/07/18	Revoca	368	27/07/2018	
Lacco Ameno	9562	30/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		9840	20/07/18	Revoca	368	27/07/2018	
Lacco Ameno	10054	30/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		9840	20/07/18	Revoca	368	27/07/2018	
Lacco Ameno	9793	14/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		10064	26/07/18	Revoca	372	13/08/2018	
Lacco Ameno	9778	31/08/2017	B	XXXXX	VIA MEZZAVIA, xx		10573	07/08/18	Revoca	373	13/08/2018	
Lacco Ameno	9815	31/08/2017	B	XXXXX	VIA MEZZAVIA, xx		10573	07/08/18	Revoca	373	13/08/2018	
Lacco Ameno	10227	29/08/2017	B	XXXXX	VIA SAN ROCCO, xx		10651	09/08/18	Revoca	371	18/08/2018	
Lacco Ameno	9741	26/08/2017	B-F	XXXXX	VIA CRATECA, xx		10982	20/08/18	Revoca	374	22/08/2018	
Lacco Ameno	10217	02/09/2017	B	XXXXX	VIA CRATECA, xx		10915	16/08/2018	Revoca	375	28/08/2018	
Lacco Ameno	10086	05/09/2017	C	XXXXX	VIA CRATECA, xx		10806	13/08/18	Revoca	379	11/09/2018	
Lacco Ameno	9868BIS*	31/08/2017	C	XXXXX	PIAZZA ROSARIO, xx		10950	17/08/18	Revoca	377	11/09/2018	
Lacco Ameno	9657	31/08/2017	C	XXXXX	PIAZZA ROSARIO, xx		10951	17/08/18	Revoca	377	11/09/2018	
Lacco Ameno	9664	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FUNDERA, xx		11259	24/08/18	Revoca	378	11/09/2018	
Lacco Ameno	10247	29/08/2017	B	XXXXX	VIA SAN ROCCO, xx		11428	30/08/18	Revoca	376	11/09/2018	
Lacco Ameno	10031	06/09/2017	B	XXXXX	VIA PROVINCIALE LACCO FANGO, xx		12136	14/09/18	Revoca	380	18/09/2018	
Lacco Ameno	9535	01/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		12085	13/09/18	Revoca	381	28/09/2018	
Lacco Ameno	10041	01/09/2017	B	XXXXX			12085	13/09/18	Revoca	381	28/09/2018	
Lacco Ameno	10206tris	31/08/2017	B-F	XXXXX	VIA BORBONICA, xx		658	21/01/19	Revoca	392	24/01/2019	
Lacco Ameno	9533	03/09/2017	E-F	XXXXX	VIA ROMA, xx		16106 - 16107	12/12/18	Revoca	402	26/04/2019	
Lacco Ameno	11297	24/09/2017	E	XXXXX	VIA BORBONICA, xx		4766	29/04/19	Revoca	400	20/06/2019	
Lacco Ameno	9812	30/11/2017	B	XXXXX	VIA ROMA, xx		6014	28/05/19	Revoca	399	20/06/2019	
Lacco Ameno	9720	13/09/2017	B	XXXXX	C.SO ANGELO RIZZOLI, xx		6631	11/06/19	Revoca	398	20/06/2019	
Lacco Ameno	9631	26/09/2017	B	XXXXX	VIA ROMA, xx		6844	14/06/2019	Revoca	397	20/06/2019	
Lacco Ameno	9663	26/09/2017	B	XXXXX	VIA ROMA, xx		6844	14/06/19	Revoca	397	20/06/2019	
Lacco Ameno	11437	26/09/2017	B	XXXXX	VIA ROMA, xx		6844	14/06/19	Revoca	397	20/06/2019	
Lacco Ameno	9806	01/09/2017	E-F	XXXXX	VIA ROMA, xx		16106-16107	12/12/18	Revoca	402	24/06/2019	
Lacco Ameno	9806*bis	01/09/2017	E-F	XXXXX	VIA ROMA, xx		16106-16107	12/12/18	Revoca	402	24/06/2019	

Lacco Ameno

Lacco Ameno	9816	03/09/2017	E-F	XXXXX	VIA ROMA, xx		16106-16107	12/12/18	Revoca	402	24/06/2019	
Lacco Ameno	9779	28/08/2017	C-F	XXXXX	VIA BORBONICA, xx		6901	17/06/19	Revoca	405	26/06/2019	
Lacco Ameno	9554BIS	13/09/2017	B	XXXXX			7217	25/06/19	Revoca	403	26/06/2019	
Lacco Ameno	9665	09/09/2017	E	XXXXX	VIA BORBONICA, xx		8619	23/07/19	Revoca	409	29/07/2019	
Lacco Ameno	9959	06/08/2017	A	XXXXX	VIA CASA PERA, xx		6628	11/06/19	Revoca	411	31/07/2019	
Lacco Ameno	9731	02/09/2017	A-F	XXXXX	PRIMA TRAVERSA GIOSAFATTE MARONE, xx		8918	19/06/19	Revoca	410	31/07/2019	
Lacco Ameno	10051	06/09/2017	C	XXXXX	VIA LACCO FANGO, xx	SCIA	9504	12/08/19	Revoca	415	18/09/2019	X
Lacco Ameno	9868	31/08/2017	C	XXXXX	PIAZZA ROSARIO, xx		10165	05/09/19	Revoca	414	18/09/2019	
Lacco Ameno	10040	31/08/2017	C	XXXXX	VIA ROSARIO, xx		10165	05/09/19	Revoca	414	18/09/2019	
Lacco Ameno	11134	31/08/2017	C	XXXXX	PIAZZA ROSARIO, xx		10165	05/09/19	Revoca	414	18/09/2019	
Lacco Ameno	10019	31/08/2017	C	XXXXX	VIA ROSARIO, xx		14318	09/11/17	Revoca	132	21/11/2017	
Lacco Ameno	9855BIS*	31/08/2017	C	XXXXX			14318	09/11/17	Revoca	132	21/11/2017	
Lacco Ameno	9855TRIS*	31/08/2017	C	XXXXX			14319	09/11/17	Revoca	132	21/11/2017	
Lacco Ameno	9552	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		12893	11/10/17	Revoca	133	21/11/2017	
Lacco Ameno	10308	07/09/2017	B	XXXXX	Via Circumvalazione		13427	24/10/17	Revoca	135	21/11/2017	
Lacco Ameno	10186	10/09/2017	B	XXXXX	via notar filippo de siano, xx		14530	15/11/2017	Revoca	134	21/11/2017	
Lacco Ameno	9795	03/09/2017	B	XXXXX	VIA VICINALE PANNELLA, xx		15954	15/12/17	Revoca	209	22/12/2017	
Lacco Ameno	9714	06/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		15939	15/12/17	Revoca	210	22/12/2017	
Lacco Ameno	9859	03/09/2017	B	XXXXX	VIA VICINALE PANNELLA, xx		15954	15/12/17	Revoca	209	22/12/2017	
Lacco Ameno	10724-5*	23/09/2017	C	XXXXX	Via Circumvalazione		12909	01/10/18	Revoca	384	11/10/2018	
Lacco Ameno	9699	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FUNDERA, xx		12969	02/10/18	Revoca	383	11/10/2018	
Lacco Ameno	10713	23/09/2017	C	XXXXX	Via Circumvalazione		12971	02/10/18	Revoca	384	11/10/2018	
Lacco Ameno	10724	23/09/2017	C	XXXXX	Via Circumvalazione		12971	02/10/18	Revoca	384	11/10/2018	
Lacco Ameno	10724-4*	23/09/2017	C	XXXXX	Via Circumvalazione		12971	02/10/18	Revoca	384	11/10/2018	
Lacco Ameno	10130	05/09/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		13972	25/10/18	Revoca	385	12/11/2018	
Lacco Ameno	9536	29/08/2017	B	XXXXX	VIA SAN ROCCO, xx		14674	12/11/18	Revoca	387	29/11/2018	
Lacco Ameno	10018	29/08/2017	B	XXXXX			14674	12/11/18	Revoca	387	29/11/2018	
Lacco Ameno	11007BIS	26/08/2017	B-F	XXXXX	VIA CRATECA, xx	CILA	8	02/01/18	Revoca	216	04/01/2018	X
Lacco Ameno	9602	01/09/2017	B	XXXXX	VIA VINCENZO MORGERA, xx		1261	25/01/18	Revoca	282	05/02/2018	
Lacco Ameno	10215	01/09/2017	B	XXXXX			1261	25/01/18	Revoca	282	05/02/2018	
Lacco Ameno	9907	05/09/2017	B	XXXXX	C.SO ANGELO RIZZOLI, xx		1383	29/01/18	Revoca	284	05/02/2018	
Lacco Ameno	10210	06/09/2017	B	XXXXX	C.SO ANGELO RIZZOLI, xx		1383	29/01/18	Revoca	284	05/02/2018	
Lacco Ameno	9875	05/09/2017	B	XXXXX	C.SO ANGELO RIZZOLI, xx		1502	30/01/18	Revoca	283	05/02/2018	
Lacco Ameno	9728	31/08/2017	C	XXXXX	VIA ROSARIO, xx		1620	01/02/18	Revoca	289	06/02/2018	
Lacco Ameno	9613QUINTER*	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		3275	02/03/18	Revoca	307	08/03/2018	
Lacco Ameno	9595	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		5135	11/04/18	Revoca	351	03/05/2018	
Lacco Ameno	9613	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		5135	11/04/18	Revoca	351	03/05/2018	
Lacco Ameno	9930	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		5135	11/04/18	Revoca	351	03/05/2018	
Lacco Ameno	10230	31/08/2017	B	XXXXX	VIA FANGO, xx		5135	11/04/18	Revoca	351	03/05/2018	
Lacco Ameno	9755	16/04/2018	A	XXXXX	VIA BARANTE, xx		AEDES N.2	16/04/18	Revoca	353	03/05/2018	
Lacco Ameno	9780	16/04/2018	A	XXXXX	VIA BARENTE, xx		AEDES N.2	16/04/18	Revoca	353	03/05/2018	
Lacco Ameno	9901	16/04/2018	A	XXXXX	VIA BARENTE, xx		AEDES N.2	16/04/18	Revoca	353	03/05/2018	
Lacco Ameno	9873	29/08/2017	B	XXXXX	VIA SAN ROCCO, xx		5662	23/04/18	Revoca	350	03/05/2018	
Lacco Ameno	10441BIS	12/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		5641	23/04/18	Revoca	352	03/05/2018	
Lacco Ameno	10244	16/04/2018	A	XXXXX	VIA TOMMASO DE SIANO, xx		AEDES N.3	16/04/18	Revoca	356	09/05/2018	
Lacco Ameno	10982	11/09/2017	B	XXXXX	VIA ROMA, xx		7516	01/06/18	Revoca	358	07/06/2018	
Lacco Ameno	9850	02/09/2017	B	XXXXX	via notar filippo de siano, xx		8971	03/07/18	Revoca	364	09/07/2018	
Lacco Ameno	9727	31/08/2017	B	XXXXX	VIA ROSARIO, xx		10243	31/07/18	Revoca	369	07/08/2018	
Lacco Ameno	10221	06/09/2017	B	XXXXX	VIA CRATECA, xx		10280	01/08/18	Revoca	370	07/08/2018	
Lacco Ameno	10206	31/08/2017	B-F	XXXXX	VIA BORBONICA, xx		3059	18/03/19	Revoca	394	01/04/2019	
Lacco Ameno	9530	01/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		6974	18/06/19	Revoca	407	04/07/2019	
Lacco Ameno	10899 BIS	12/09/2017	B	XXXXX	C.SO ANGELO RIZZOLI, xx		7503	01/07/19	Revoca	406	04/07/2019	
Lacco Ameno	9737	11/09/2017	B	XXXXX	VIA PANNELLA, xx		8947	30/07/19	Revoca	412	06/08/2019	
Lacco Ameno	9716	31/08/2017	C	XXXXX	VIA ROSARIO, xx		1620	01/02/18	Revoca			
Lacco Ameno	9836	31/08/2017	C	XXXXX	VIA ROSARIO, xx		1620	01/02/18	Revoca			



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

3. ALLEGATO 1B – REPORT PRIMI INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMMOBILI DANNEGGIATI

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	TITOLO EDILIZIO
462	B	VIA PRINCIPE TOMMASO, xx	XXXXX	CILA
				
				
LAVORI ULTIMATI				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	TITOLO EDILIZIO
27	B	VIA PRINCIPESSA MARGHERITA, xx	XXXXX	SCIA



LAVORI ULTIMATI



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

COMUNE DI LACCO AMENO				
N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	TITOLO EDILIZIO
246	B - F	VIA CREATECA, xx	XXXXX	CILA
				
				
LAVORI ULTIMATI				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

COMUNE DI LACCO AMENO

N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	TITOLO EDILIZIO
1479	C	VIA LACCO FANGO, xx	XXXXX	SCIA
				
				
LAVORI ULTIMATI				



4. ALLEGATO 2 – REPORT INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

Il Commissario straordinario, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 18, comma 1, lett. i-bis) del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 e dell'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 587 dell'11 aprile 2019, provvede a portare ad esecuzione gli interventi di gestione dell'emergenza pianificati ed avviati dal cessato Commissario delegato.

A seguito della trasmissione da parte del cessato Commissario delegato della documentazione e della relazione conclusiva inerente agli interventi emergenziali contenuti nel piano di cui all'art. 1 comma 4 dell'OCDPC n. 476/2017, con nota prot. n. 229, pervenuta a questa struttura in data 29/04/2019, si è proceduto ad avviare le attività di verifica istruttoria ed erogazione delle somme, al fine di concludere le procedure amministrative autorizzate dal Commissario delegato che riguardano, sostanzialmente, il pagamento del CAS, delle spese di ospitalità alberghiera nonché degli interventi di somma urgenza ed urgenza contenuti nei piani di cui sopra.

Nel presente allegato è riportato lo stato di attuazione delle attività alla data odierna con riferimento agli interventi presenti nel seguente elenco:

- Elenco interventi B – attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017;

Gli interventi realizzati dagli Enti pubblici nell'immediatezza dell'evento sismico, ricorrendo all'istituto della "somma urgenza", inerenti alla messa in sicurezza delle aree e inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) dell'OCDPC 476/2017 sono in numero 18, per un importo totale pari ad €. 3.034.711,98 di cui:

- n. 12 interventi realizzati dal Comune di Casamicciola Terme;
- n. 1 intervento realizzato dal Comune di Forio;
- n. 5 interventi realizzati dal Comune di Lacco Ameno.

Premesso che in fase di emergenza (agosto 2017 - febbraio 2019) il Commissario delegato non ha erogato alcuna somma per tale voce di spesa, si fa presente che:



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- per n. 9 interventi il procedimento di riconoscimento dei fondi si è concluso positivamente e sono stati erogati fondi per un importo totale pari ad €. 1.170.139,14 €:
 - Intervento codice **01/SU/01** - lavori di somma urgenza riscontrata presso la Via Spezieria - Comune di Casamicciola Terme. Trasferiti €. **157.859,44** al S.A., in data 16 settembre 2019, con Decreto n. 247;
 - Intervento codice **01/SU/03** - lavori di somma urgenza riscontrata presso Piazza Maio - Comune di Casamicciola Terme. Trasferiti €. **180.659,83** al S.A., in data 1 agosto 2019, con Decreto n. 195;
 - Intervento codice **01/SU/04** - lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità locali CAPRICO da destinare a sede provvisoria Comunale, COC, Dip. Prot. Civile - Comune di Casamicciola Terme. Trasferiti €. **38.500,00** al S.A., in data 14 maggio 2020, con Decreto n. 539;
 - Intervento codice **01/SU/06** - lavori di somma urgenza riscontrata presso l'edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato "De Gasperi" - Comune di Casamicciola Terme. Trasferiti €. **191.181,70** al S.A., in data 16 settembre 2019, con Decreto n. 248;
 - Intervento codice **01/SU/10** - lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile sito alla piazza delle scuole, utilizzato dal Comando Vigili Urbani, via Castinito e via Piccola Sentinella - Comune di Casamicciola Terme. Trasferiti €. **93.605,61** al S.A., in data 26 e 27 marzo 2020, rispettivamente, con Decreto nn. 485 e 486;
 - Intervento codice **03/SU/01** - nolo mezzi per ripulitura spazi ed aree pubbliche, fognature e ripristino immobili privati - Comune di Lacco Ameno. Trasferiti €. **187.129,59** al S.A., in data 31 marzo 2020, con Decreto n. 492;
 - Intervento codice **03/SU/02** - messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione - Comune di Lacco Ameno. Trasferiti €. **12.785,60** al S.A., in data 8 giugno 2020, con Decreto n. 567;
 - Intervento codice **03/SU/04** - fornitura di materiale per il puntellamento e la messa in sicurezza del tratto viario via Borbonica civv. 39, 41, 43, 45 - Comune di Lacco Ameno. Trasferiti €. **124.028,86** al S.A., in data 27 luglio 2020, con Decreto n. 631;
 - Intervento codice **03/SU/05** - ripristino condizioni di sicurezza plessi scolastici - Comune di Lacco Ameno. Trasferiti €. **184.388,47** al S.A., in data 4 novembre 2019, con Decreto n. 322;
- per n. 3 interventi il procedimento di riconoscimento dei fondi è sospeso in quanto si è in attesa di ricevere dai soggetti attuatori le integrazioni richieste;
- per n. 3 interventi il procedimento di riconoscimento dei fondi è in fase istruttoria;
- per n. 3 interventi si è in attesa di ricevere istanza per il riconoscimento e ristoro dei fondi da parte dei Soggetti attuatori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

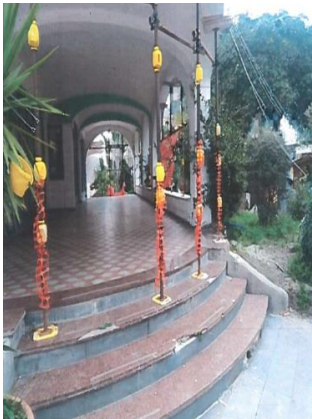
N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
1	01/SU/01	Comune di Casamicciola Terme	Lavori di somma urgenza riscontrata presso la Via Spezieria	€. 196.720,00
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
n. 247 del 16/09/2019		€. 157.859,44	Lavori chiusi - Procedimento di finanziamento concluso (Realizzato il 100% dei lavori previsti)	

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
2	01/SU/02	Comune di Casamicciola Terme	Lavori di somma urgenza riscontrata presso la Via Montecito	€. 196.720,00
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
In attesa di ricevere l'istanza indirizzata al Commissario straordinario per il ristoro delle somme spese.			Lavori chiusi – Procedimento di finanziamento in corso (Realizzato il 50% dei lavori previsti) Lavori sospesi ad aprile 2018 - intervenuta informativa antimafia	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
3	01/SU/03	Comune di Casamicciola Terme	Lavori di somma urgenza riscontrata presso la Piazza Maio	€. 196.720,00
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
n. 195 del 01/08/2019		€. 180.659,83	Lavori chiusi - Procedimento di finanziamento concluso (Realizzato il 100% dei lavori previsti)	

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
4	01/SU/04	Comune di Casamicciola Terme	Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità locali CAPRICHO da destinare a sede provvisoria Comunale, COC, Dip. Prot. Civile	€. 38.500,00
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
n. 539 del 14/05/2020		€. 38.500,00	Lavori chiusi - Procedimento di finanziamento concluso (Realizzato il 100% dei lavori previsti)	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
5	01/SU/05	Comune di Casamicciola Terme	Lavori di somma urgenza per l'emergenza riscontrata presso l'edificio sito in viale Paradisiello n° 6	€. 41.800,00
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
-		€. -	Lavori chiusi - Procedimento di finanz. in corso - In attesa di integr. (Realizzato il 100% dei lavori previsti)	

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
6	01/SU/06	Comune di Casamicciola Terme	Lavori di somma urgenza riscontrata presso l'edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato "De Gasperi"	€. 211.720,00
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
n. 248 del 16/09/2019		€. 191.181,70	Lavori chiusi - Procedimento di finanziamento concluso (Realizzato il 100% dei lavori previsti)	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
7	01/SU/07	Comune di Casamicciola Terme	Lavori si somma urgenza riscontrata presso il Pio Monte della Misericordia e del Plesso Manzoni	€. 77.000,00
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
-		€. -	Lavori chiusi - Procedimento di finanz. in corso - In attesa di integr. (Realizzato il 100% dei lavori previsti)	

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
8	01/SU/08	Comune di Casamicciola Terme	Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza degli immobili siti in Via Principessa Margherita utilizzati quale sede comunale e museo	€. 380.752,00
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
In attesa di ricevere l'istanza indirizzata al Commissario straordinario per il ristoro delle somme spese.			Lavori chiusi – Procedimento di finanziamento in corso (Realizzato il 15% dei lavori previsti)	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
9	01/SU/09	Comune di Casamicciola Terme	Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza di Via De Rivaz volto al transito veicolare e pedonale in sicurezza	€. 118.780,64
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
-		€. -	Lavori chiusi – Procedimento di finanziamento in corso (Realizzato il 10% dei lavori previsti)	

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
10	01/SU/10	Comune di Casamicciola Terme	Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile sito alla Piazza delle Scuole utilizzato dal Comando vigili del Comune di Casamicciola Terme e di Via Castanito e di Via Piccola Sentinella	€. 476.784,00
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
n. 485 del 26/03/2019 n. 486 del 27/03/2020		€. 93.605,61	Lavori chiusi – Procedimento di finanziamento concluso (Realizzato il 20 % dei lavori previsti)	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
11	01/SU/11	Comune di Casamicciola Terme	Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza di Via Epomeo, Via Gran Sentinella e Via Iasolino volto alla riapertura dei tratti viari interessati per consentire l'accesso ai nuclei abitati	€. 488.040,00
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
-		€. -	Lavori chiusi – Procedimento di finanz. in corso - In attesa di integr. (Realizzato il 95 % dei lavori previsti)	

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
12	01/SU/12	Comune di Casamicciola Terme	Puntellamento fabbricato prospiciente Via Santa Barbara di proprietà Massa Magliuolo	€. 38.725,06
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
-		€. -	Lavori chiusi - Procedimento di finanziamento in corso (Realizzato il 100 % dei lavori previsti)	



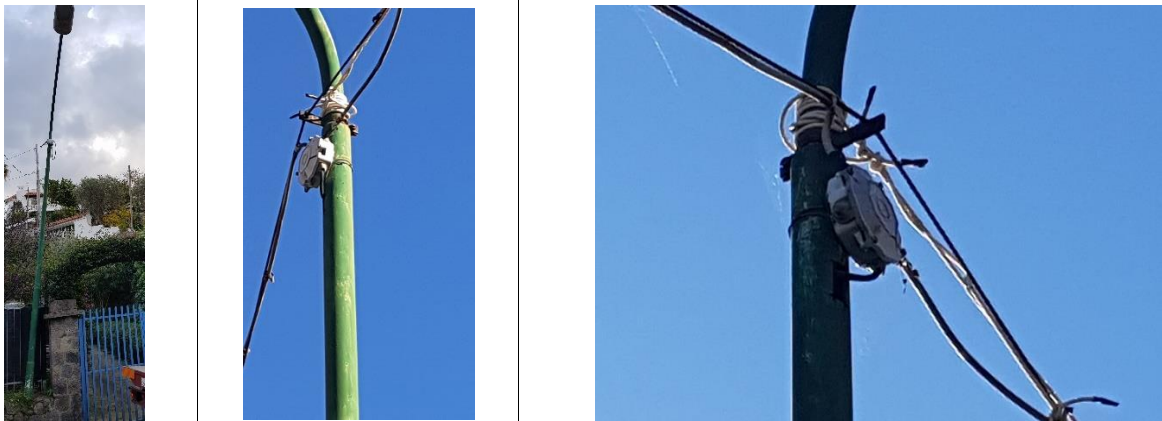
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
13	02/SU/02	Comune di Forio	Messa in sicurezza tratto viario Via Cava Scialicco	€. 48.343,00
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
In attesa di ricevere l'istanza indirizzata al Commissario straordinario per il ristoro delle somme spese.			Lavori chiusi – Procedimento di finanziamento in corso (Realizzato il 100% dei lavori previsti)	

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
14	03/SU/01	Comune di Lacco Ameno	Nolo mezzi per ripulitura spazi ed aree pubbliche, fognature e ripristino immobili privati – Strade varie	€. 187.129,59
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
n. 492 del 31/03/2020		€. 190.511,57	Lavori chiusi – Procedimento di finanziamento concluso (Realizzato il 100 % dei lavori previsti)	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
15	03/SU/02	Comune di Lacco Ameno	Messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione - Via Cava Scialicco, Via Casa Pera e in Via ex provinciale Lacco - Fango	€. 12.786,82
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
n. 567 del 08/06/2020		€. 12.785,60	Lavori chiusi – Procedimento di finanziamento concluso (Realizzato il 100 % dei lavori previsti)	

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
16	03/SU/03	Comune di Lacco Ameno	Altri interventi (regimazione alveo, messa in sicurezza sede stradale) - Alveo Via Cava Scialicco e Sede Comunale	€. 15.753,54
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
-		€. -	Lavori chiusi – Procedimento di finanziamento in corso (Realizzato il 100 % dei lavori previsti)	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
17	03/SU/04	Comune di Lacco Ameno	Materiale per il puntellamento e la messa in sicurezza del tratto viario – Via Borbonica civv. 39-41-43-45 e Via Crateca	€. 124.028,90
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
n. 631 del 27/07/2020		€. 124.028,86	Lavori chiusi – Procedimento di finanziamento concluso (<i>Realizzato il 100% dei lavori previsti</i>)	

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
18	03/SU/05	Comune di Lacco Ameno	Ripristino condizioni di sicurezza plessi scolastici – Edificio in Via Fundera, Via Pannella e in Villa Arbusto	€. 184.388,47
				
Decreto di erogazione		Importo erogato	Annotazioni	
n. 322 del 04/11/2019		€. 184.388,47	Lavori chiusi – Procedimento di finanziamento concluso (<i>Realizzato il 100% dei lavori previsti</i>)	



5. ALLEGATO 3 – REPORT INTERVENTI URGENTI

Il Commissario straordinario, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 18, comma 1, lett. i-bis) del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 e dell'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 587 dell'11 aprile 2019, provvede a portare ad esecuzione gli interventi di gestione dell'emergenza pianificati ed avviati dal cessato Commissario delegato.

A seguito della trasmissione da parte del cessato Commissario Delegato della documentazione e della relazione conclusiva inerente agli interventi emergenziali contenuti nel piano di cui all'art. 1 comma 4 dell'OCDPC n. 476/2017, con nota prot. n. 229, pervenuta a questa struttura in data 29/04/2019, si è proceduto ad avviare le attività di verifica istruttoria ed erogazione delle somme, al fine di concludere le procedure amministrative autorizzate dal Commissario Delegato che riguardano, sostanzialmente, il pagamento del CAS, delle spese di ospitalità alberghiera nonché degli interventi di somma urgenza ed urgenza contenuti nei piani di cui sopra.

Nel presente allegato è riportato lo stato di attuazione delle attività alla data del 30 aprile 2020 con riferimento agli interventi presenti nel seguente elenco:

- Elenco interventi C – interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCPDC 476/2017;

In tale elenco sono riportati gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o beni, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) dell'OCDPC 476/2017. Tale voce di spesa consta di 18 interventi, per un importo totale da piano pari ad €. 5.567.803,29 di cui:

- n. 9 interventi attuati dal Comune di Casamicciola Terme;
- n. 1 intervento attuato dal Comune di Forio
- n. 2 interventi attuati dal Comune di Lacco Ameno;
- n. 5 interventi attuati dalla Città Metropolitana di Napoli.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Per i succitati interventi, secondo quanto disposto da alcune convenzioni all'uopo stipulate tra il Commissario delegato e i rappresentanti legali degli Enti pubblici, il riconoscimento e l'erogazione dei fondi avviene - previa acquisizione della stabilita documentazione - secondo i seguenti termini:

- 1^a rata di anticipazione, pari al 10% dell'importo da piano;
- 2^a rata pari al 30% dell'importo finanziato così come rimodulato a seguito delle aggiudicazioni;
- 3^a rata pari al 40% dell'importo rideterminato, previa rendicontazione della spesa da parte del beneficiario di almeno il 90% dell'importo complessivo ricevuto a quel momento;
- 4^a rata pari al saldo delle spese per l'intervento.

In proposito si fa presente che per alcuni interventi non era stata formalizzata apposita convenzione e, pertanto, il Commissario straordinario ha ritenuto necessario procedere in analogia con le regole stabilite nelle predette convenzioni stipulate.

Allo stato il trasferimento dei fondi si può riassumere come segue:

- per n. 9 interventi è stata erogata la 1^a rata del 10% per un importo totale pari ad €. 350.516,16:
 - Intervento codice **01/U/01** – Rimozione macerie alla Via Serrato e lavori di messa in sicurezza alla Via D'Aloisio – Comune di Casamicciola Terme. Trasferiti €. **73.136,19** al S.A., in data 05 agosto 2019, con Decreto n. 203;
 - Intervento codice **01/U/03** – Messa in sicurezza del tratto di strada di Via Roma che affaccia su Via De Rivaz mediante consolidamento del muro di contenimento – Comune di Casamicciola Terme. Trasferiti €. **16.467,00** al S.A., in data 15/01/2020, con Decreto n. 395;
 - Intervento codice **01/U/04** – Demolizione fabbricato posto tra Corso Garibaldi e Via Ombrasco per possibile crollo su strada – Comune di Casamicciola Terme. Trasferiti €. **7.356,40** al S.A., in data 04 novembre 2019, con Decreto n. 319;
 - Intervento codice **01/U/05** – Messa in sicurezza del tratto di strada Via Vicinale Monte Tabor mediante consolidamento del muro di contenimento – Comune di Casamicciola Terme. Trasferiti €. **15.094,80** al S.A., in data 15 novembre 2019, con Decreto n. 351;
 - Intervento codice **01/U/06** – Consolidamento strada Via Cognole, mediante palificata, a protezione abitazione – Comune di Casamicciola Terme. Trasferiti €. **19.897,70** al S.A., in data 04 novembre 2019, con Decreto n. 320;




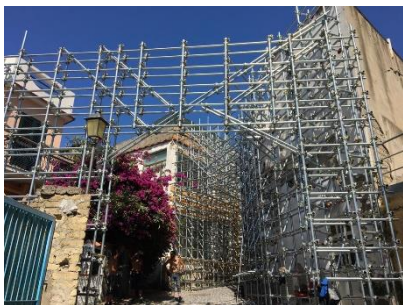
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- Intervento codice **01/U/07** – Consolidamento terrapieno su cui insiste edificio scolastico Manzoni anche a protezione abitazioni sottostanti – Comune di Casamicciola Terme. Trasferiti **€. 24.700,60** al S.A., in data 19 novembre 2019, con Decreto n. 352;
- Intervento codice **03/U/01** – Messa in sicurezza arterie stradali. Ricostruzione muri di contenimento e di delimitazione strade comunali – Comune di Lacco Ameno. Trasferiti **€. 131.939,07** al S.A., in data 23 agosto 2018, con Ordinanza del Commissario delegato n. 98;
- Intervento codice **05/U/01** – Sisma 21/08/2017 - SP431 Borbonica – rifacimento muro sostegno parzialmente ruotato - Città Metropolitana di Napoli. Trasferiti in totale **€. 27.000,00** al S.A., in data 27 luglio 2020, con Decreto n. 630;
- Intervento codice **05/U/04_10** – Sisma 21/08/2017 - SP431 e SP149 – Interventi localizzati di sistemazione di opere murarie di contenimento (Accorpamento progetti 05/U/04 e 05/U/10 - Città Metropolitana di Napoli. Trasferiti in totale **€. 39.424,40** al S.A., in data 27 luglio 2020, con Decreto n. 629;
- per n. 2 interventi sono stati erogati fondi fino alla 3^a rata per un importo totale pari ad **€.649.274,89**:
 - Intervento codice **01/U/09** – Opere di completamento edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato "De Gasperi" – Comune di Casamicciola Terme. Trasferiti in totale **€. 214.958,09** al S.A., con Decreti nn. 115 del 28 maggio 2019, 208 del 09 agosto 2019 e 291 del 10 ottobre 2019;
 - Intervento codice **05/U/02** – Sisma 21/08/2017 - SP505 e SP431 - ricostruzione parapetti murari e adeguamento nei confronti delle azieni sismiche – Città Metropolitana di Napoli. Trasferiti in totale **€. 434.316,80** al S.A., con Decreti nn. 188 del 25 luglio 2019, 406 del 17 gennaio 2020 e 513 del 20 aprile 2020.
- per n. 3 interventi il procedimento di riconoscimento dei fondi è sospeso in quanto si è in attesa di ricevere dai soggetti attuatori le integrazioni richieste;
- per n. 2 interventi si è in attesa di ricevere istanza per il riconoscimento e ristoro dei fondi, da parte dei soggetti attuatori.

Si riportano di seguito le sole schede degli interventi i cui lavori sono in corso di esecuzione ovvero conclusi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano	
1	01/U/01	Comune di Casamicciola Terme	Rimozione maceria alla Via Serrato e lavori di messa in sicurezza alla Via D'Aloisio – Località: Via Serrato e Via D'Aloisio	€. 731.361,85	
					
					
Erogazione del finanziamento				Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
• I rata del 10%: erogati €. 73.136,19 con Decreto n. 203 del 05/08/2019				€. 73.136,19	Lavori in corso
• Il rata del 30%: procedimento di finanziamento in istruttoria					

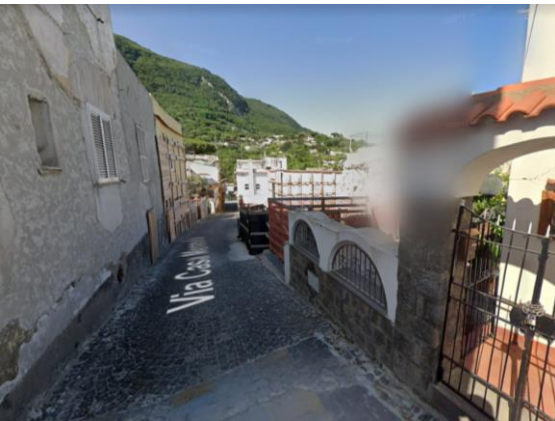


Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
8	01/U/09	Comune di Casamicciola Terme	Opere di completamento edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato "De Gasperi" – Località: C.so L. Manzi	€. 309.356,73
				
				
Erogazione del finanziamento				Importo totale erogato
• I rata del 10%: erogati €. 30.935,67 con Decreto n. 115 del 28/05/2019 • II rata del 30%: erogati €. 73.805,59 con Decreto n. 208 del 08/09/2019 • III rata del 40%: erogati €. 110.216,83 con Decreto n. 291 del 10/10/2019				€. 214.958,09
				Stato attuazione intervento
				<i>Lavori ultimati</i>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
9	01/U/10	Comune di Casamicciola Terme	Rimozione macerie per ripristino viabilità e puntellamento fabbricati pericolanti – Località: Via Casamennella	€. 259.668,55
 				
 				
Erogazione del finanziamento			Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
In attesa di ricevere l'istanza per il trasferimento dei fondi.			€. -	<i>Lavori ultimati</i>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano	
10	02/U/01	Comune di Forio	Manutenzione straordinaria presso la palestra della scuola media D'Abundo – Località: Via Cava Sciallicco	€. 205.840,66	
					
					
Erogazione del finanziamento				Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
• Procedimento di finanziamento sospeso – In attesa di integrazioni				€. -	Lavori ultimati



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
11	03/U/01	Comune di Lacco Ameno	Messa in sicurezza arterie stradali. Ricostruzione muri di contenimento e di delimitazione strade comunali	€. 892.509,59
				
				
Erogazione del finanziamento			Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
• I rata del 10%: erogati €. 131.939,07 con Ordinanza n. 98 del 23/08/2018 • II rata del 30%: procedimento di finanziamento in istruttoria			€. 131.939,07	<i>Lavori in corso</i>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
14	05/U/02	Città Metropolitana di Napoli	Sisma 21/08/2017 - SP505 e SP431 - ricostruzione parapetti murari e adeguamento nei confronti delle azioni sismiche – Località: Casamicciola Terme e Lacco Ameno	€. 807.200,00
				
				
Erogazione del finanziamento				Importo totale erogato
• I rata del 10%: erogati €. 80.720,00 con Decreto n. 188 del 25/07/2019 • II rata del 30%: erogati €. 151.541,49 con Decreto n. 406 del 17/01/2020 • III rata del 40%: erogati €. 202.055,31 con Decreto n. 513 del 20/04/2020 • IV rata di SALDO: procedimento di finanziamento in istruttoria				€. 434.316,80
				Stato attuazione intervento
				Lavori ultimati



6. ALLEGATO 4 – REPORT INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BENI CULTURALI

Il Commissario straordinario, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 18, comma 1, lett. i-bis) del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 e dell'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 587 dell'11 aprile 2019, provvede a portare ad esecuzione gli interventi di gestione dell'emergenza pianificati ed avviati dal cessato Commissario delegato.

A seguito della trasmissione da parte del cessato Commissario Delegato della documentazione e della relazione conclusiva inerente agli interventi emergenziali contenuti nel piano di cui all'art. 1 comma 4 dell'OCDPC n. 476/2017, con nota prot. n. 229, pervenuta a questa struttura in data 29/04/2019, si è proceduto ad avviare le attività di verifica istruttoria ed erogazione delle somme, al fine di concludere le procedure amministrative autorizzate dal Commissario Delegato che riguardano, sostanzialmente, il pagamento del CAS, delle spese di ospitalità alberghiera nonché degli interventi di somma urgenza ed urgenza contenuti nei piani di cui sopra.

Nel presente allegato è riportato lo stato di attuazione delle attività alla data del 30 aprile 2020 con riferimento agli interventi presenti nel seguente elenco:

- Elenco interventi D – interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017.

In tale elenco sono ricompresi gli interventi attuati dal MIBAC di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico di cui all'articolo 6 dell'OCDPC 476/2017. Tale voce di spesa consta di 17 interventi, a cui si aggiunge un fondo di riserva in ragione delle economie già accertate, per un importo totale da piano pari ad €. 1.000.0000 di cui:

- n. 7 interventi attuati dal Mibac presso Chiese site nel Comune di Casamicciola Terme;
- n. 5 interventi attuati dal Mibac presso Chiese site nel Comune di Forio;
- n. 1 intervento attuato dal Mibac presso Chiese site nel Comune di Lacco Ameno;
- n. 4 interventi attuati dal Mibac per liquidazione spese varie (lavoro straordinario, rilievo danni, missioni, etc...)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Allo stato, premesso che in fase di emergenza il Commissario delegato ha liquidato solamente alcuni interventi (cod. 06/BC/14, 06/BC/15, 06/BC/16, 06/BC/17) per complessivi €. 12.268,16, si fa presente che:

- per n. 9 interventi il procedimento di riconoscimento dei fondi, relativi ai soli lavori, si è concluso positivamente e sono stati erogate somme per un importo totale pari ad €. 658.015,55:
 - Intervento codice **06/BC/02** – Chiesa di Santa Maria della Pietà nel Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria, rete protettiva navata, transennamenti. Erogati in totale €. **59.839,21** con Decreto n. 214 del 03/09/2019;
 - Intervento codice **06/BC/03** – Chiesa di San Pasquale Baylon nel Comune di Casamicciola Terme: Cerchiatura/tiranti vela campanaria, rifacimento partine e copertura smonto vano scala, transennamenti. Erogati in totale €. **52.634,12** con Decreto n. 215 del 03/09/2019;
 - Intervento codice **06/BC/04** – Chiesa di Sant'Antonio da Padova nel Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria. Erogati in totale €. **18.175,37** con Decreto n. 216 del 03/09/2019;
 - Intervento codice **06/BC/05** – Basilica di Santa Maria Maddalena nel Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza localizzati, puntellamenti, messa in sicurezza beni storico-artistici. Erogati in totale €. **208.297,42** con Decreto n. 202 del 05/08/2019;
 - Intervento codice **06/BC/06** – Chiesa dell'Immacolata nel Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza localizzati, spostamento opere d'arte. Erogati in totale €. **67.627,16** con Decreto n. 201 del 05/08/2019;
 - Intervento codice **06/BC/08** – Chiesa di Santa Maria di Loreto nel Comune di Forio: Messa in sicurezza localizzati, messa in sicurezza beni storico - artistici. Erogati in totale €. **119.629,19** con Decreti n. 200 del 05/08/2019 e n. 275 del 01/10/2019;
 - Intervento codice **06/BC/09** – Chiesa parrocchiale di San Sebastiano nel Comune di Forio: Messa in sicurezza localizzati. Erogati in totale €. **37.309,96** con Decreti n. 130 del 10/06/2019 e n. 217 del 03/09/2019;
 - Intervento codice **06/BC/10** – Chiesa di San Michele Arcangelo detta del Purgatorio nel Comune di Forio: Messa in sicurezza localizzati. Erogati in totale €. **56.722,82** con Decreto n. 218 del 03/09/2019;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- Intervento codice **06/BC/13** – Chiesa della SS. Annunziata nel Comune di Lacco Ameno: Messa in sicurezza localizzati. Erogati in totale **€. 37.780,30** con Decreto n. 129 del 10/06/2019;
- per n. 4 interventi il procedimento di riconoscimento dei fondi è sospeso in quanto si è in attesa di ricevere dai soggetti attuatori le integrazioni richieste.

Si partecipa che, per i precedenti interventi, sono stati liquidati i soli lavori e, pertanto, si è in attesa di ricevere eventuale istanza per il riconoscimento di parte delle “somme a disposizione” (rimborso missioni, incentivi ai tecnici interni alla S.A., etc...)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

CHIESA DI S. MARIA DEL BUON CONSIGLIO

Comune di Casamicciola Terme

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
1	06/BC/01	MIBACT-CA	Messa in sicurezza - rete di protezione sotto cassettonato parte absidale, cerchiatura/tiranti vela campanaria, transennamenti	€. 50.000,00



Erogazione del finanziamento	Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
• Procedimento di riconoscimento fondi sospeso – In attesa di integrazioni	€. -	Lavori ultimati
Annotazioni		
➤ LAVORI ESEGUITI: messa in sicurezza controsoffitto abside centrale; opere di stabilizzazione della vela campanaria; puntellatura piattabande; realizzazione controsoffittatura in cartongesso in sostituzione di quella in parte crollata; ripristino intonaci e tinteggiature.		
➤ STATO DI FATTO: APERTA AL CULTO		
➤ INTERVENTI FUTURI: edificio inserito nel quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 17 febbraio 2020		



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ

Comune di Casamicciola Terme

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
2	06/BC/02	MIBACT-CA	Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria, rete protettiva navata, transennamenti	€. 75.000,00
				
Erogazione del finanziamento			Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
• Decreto di erogazione n. 214 del 03/09/2019			€. 59.839,21	Lavori ultimati
Annotazioni				
➤ LAVORI ESEGUITI: Messa in sicurezza della torre campanaria; sbadacchiature aperture dell'aula; messa in sicurezza vano scala. ➤ STATO DI FATTO: APERTA AL CULTO ➤ INTERVENTI FUTURI: edificio inserito nel quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 17 febbraio 2020				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

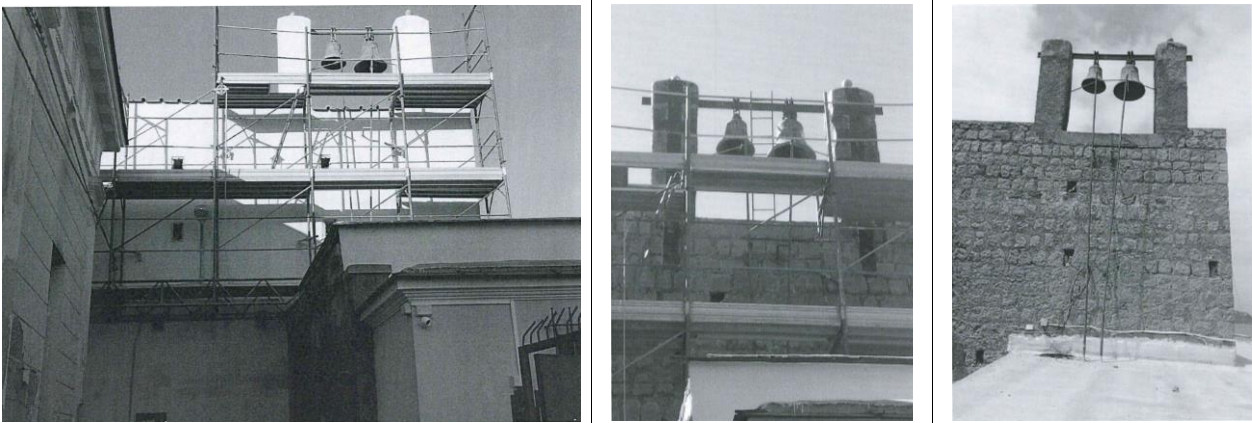
CHIESA DI SAN PASQUALE BAYLON

Comune di Casamicciola Terme

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
3	06/BC/03	MIBACT-CA	Cerchiatura/tiranti vela campanaria, rifacimento partine e copertura smonto vano scala, transennamenti	€. 75.000,00
				
Erogazione del finanziamento			Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
• Decreto di erogazione n. 215 del 03/09/2019			€. 52.634,12	Lavori ultimati
Annotazioni				
➤ LAVORI ESEGUITI: Interventi di messa in sicurezza della vela campanaria e dell'apparato decorativo danneggiato interno ed esterno la chiesa ➤ STATO DI FATTO: CHIUSA AL CULTO ➤ INTERVENTI FUTURI: edificio inserito nel quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 17 febbraio 2020				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

CHIESA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA				
Comune di Casamicciola Terme				
N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
4	06/BC/04	MIBACT-CA	Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria	€. 25.000,00
				
Erogazione del finanziamento			Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
• Decreto di erogazione n. 216 del 03/09/2019			€. 18.175,37	Lavori ultimati
Annotazioni				
➤ LAVORI ESEGUITI: Opere di messa in sicurezza della vela campanaria mediante puntellature e rinforzo di strutture in muratura con FRP; opere di finitura ➤ STATO DI FATTO: APERTA AL CULTO ➤ INTERVENTI FUTURI: edificio inserito nel quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 17 febbraio 2020				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

BASILICA SANTA MARIA MADDALENA

Comune di Casamicciola Terme

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
5	06/BC/05	MIBACT-CA	Messa in sicurezza localizzati, puntellamenti, messa in sicurezza beni storico - artistici	€. 260.000,00
				
				
Erogazione del finanziamento			Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
• Decreto di erogazione n. 202 del 05/08/2019			€. 208.297,42	Lavori ultimati
Annotazioni				
➤ LAVORI ESEGUITI: Spicconatura intonaci e murature in corrispondenza delle lesioni; sigillatura dei distacchi; arriciatura delle superfici spicconate; trattamento con passivante delle parti metalliche; fornitura e posa in opera reti di protezione anticaduta dei cornicioni esterni e navate laterali ➤ STATO DI FATTO: APERTA PARZIALMENTE AL CULTO ➤ INTERVENTI FUTURI: edificio inserito nel quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 17 febbraio 2020				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

CHIESA DELL'IMMACOLATA Comune di Casamicciola Terme				
N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
6	06/BC/06	MIBACT-CA	Messa in sicurezza localizzati, spostamento opere d'arte	€ 100.000,00
				
Erogazione del finanziamento			Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
• Decreto di erogazione n. 201 del 05/08/2019			€ 67.627,16	Lavori ultimati
Annotazioni				
➤ LAVORI ESEGUITI: Messa in sicurezza della torre campanaria; sbadacchiature apertura dell'aula; puntelli di sostegno travi interne; tirantature parete estremità del transetto ➤ STATO DI FATTO: NON APERTA AL CULTO ➤ INTERVENTI FUTURI: edificio inserito nel quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 17 febbraio 2020				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

CHIESA DI SANTA LUCIA Comune di Forio				
N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
7	06/BC/07	MIBACT-CA	Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria	€. 30.000,00
				
Erogazione del finanziamento			Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
• Decreto di erogazione n. 458 del 25/02/2020			€. 20.536,60	Lavori ultimati
Annotazioni				
➤ LAVORI ESEGUITI: Rinforzo delle strutture in muratura della vela campanaria con fibre di carbonio e con rete bidirezionale in fibra di vetro; rinforzo di porzione di solaio posto al piede della torretta campanaria; opere di finitura sulle porzioni rinforzate ➤ STATO DI FATTO: APERTA AL CULTO ➤ INTERVENTI FUTURI: edificio inserito nel quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 17 febbraio 2020				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

CHIESA DI SANTA MARIA DI LORETO

Comune di Forio

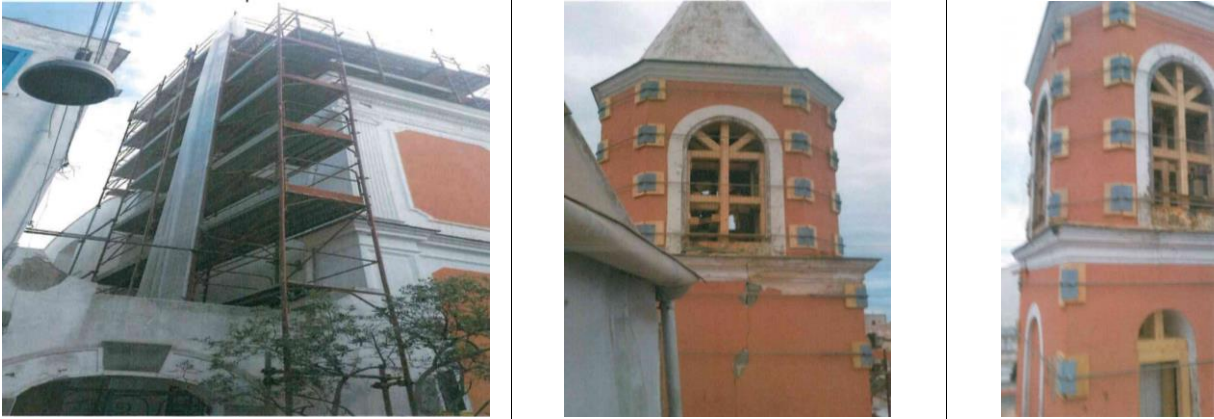
N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
8	06/BC/08	MIBACT-CA	Messa in sicurezza localizzati, messa in sicurezza beni storico – artistici e della copertura	€. 130.000,00
				
Erogazione del finanziamento			Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
- Decreto di erogazione n. 200 del 05/08/2019 - Decreto di erogazione n. 275 del 25/09/2019			€. 119.628,89	Lavori ultimati
Annotazioni				
➤ LAVORI ESEGUITI: Spicconatura intonaci e murature in corrispondenza delle lesioni e successiva sarcitura delle stesse, bloccaggio dei marmi con strutture in legno sagomate a misure con fasce appositamente realizzate ➤ STATO DI FATTO: APERTA AL CULTO ➤ INTERVENTI FUTURI: edificio inserito nel quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 17 febbraio 2020				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN SEBASTIANO

Comune di Forio

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
9	06/BC/09	MIBACT-CA	Messa in sicurezza localizzati	€. 65.000,00
				
				
Erogazione del finanziamento			Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
- Decreto di erogazione n. 130 del 10/06/2019 - Decreto di erogazione n. 217 del 03/09/2019			€. 37.309,96	Lavori ultimati
Annotazioni				
➤ LAVORI ESEGUITI: Messa in sicurezza della cella e della torre campanaria, spicconatura intonaco e stucchi, sarcitura lesioni e protezione caduta calcinacci mediante reti ➤ STATO DI FATTO: APERTA AL CULTO ➤ INTERVENTI FUTURI: edificio inserito nel quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 17 febbraio 2020				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO DETTA DEL PURGATORIO

Comune di Forio

N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
10	06/BC/10	MIBACT-CA	Messa in sicurezza localizzati	€. 80.000,00
				
Erogazione del finanziamento			Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
• Decreto di erogazione n. 218 del 03/09/2019			€. 56.722,82	Lavori ultimati
Annotazioni				
➤ LAVORI ESEGUITI: Spicconatura intonaci e murature in corrispondenza delle lesioni e successiva sarcitura delle stesse, installazione rete protettiva anticaduta calcinacci, posa in opera di guaina bituminosa sulla volta di copertura della chiesa, fasciatura vela camapanaria ➤ STATO DI FATTO: APERTA AL CULTO ➤ INTERVENTI FUTURI: edificio inserito nel quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 17 febbraio 2020				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

CHIESA DELLA SS ANNUNZIATA Comune di Lacco Ameno				
N°	Codice intervento	Soggetto attuatore	Oggetto dell'intervento	Importo da piano
12	06/BC/13	MIBACT-CA	Messa in sicurezza localizzati	€. 40.000,00
				
Erogazione del finanziamento			Importo totale erogato	Stato attuazione intervento
• Decreto di erogazione n. 129 del 10/06/2019			€. 37.780,30	Lavori ultimati
Annotazioni				
➤ LAVORI ESEGUITI: Spostamento e protezione di tutte le opere d'arte presenti nella chiesa; spicconatura intonaci e murature in corrispondenza delle lesioni e successiva sarcitura delle stesse ➤ STATO DI FATTO: APERTA AL CULTO ➤ INTERVENTI FUTURI: edificio inserito nel quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 17 febbraio 2020				



7. ALLEGATO 5 – REPORT RICOSTRUZIONE PRIVATA

In attuazione del D.L 109/2018 il Commissario Straordinario, individuati i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera c), con gli atti adottati in conformità al comma 2 del già citato articolo, ha disciplinato la ricostruzione degli immobili privati danneggiati. Le ordinanze emanate sono:

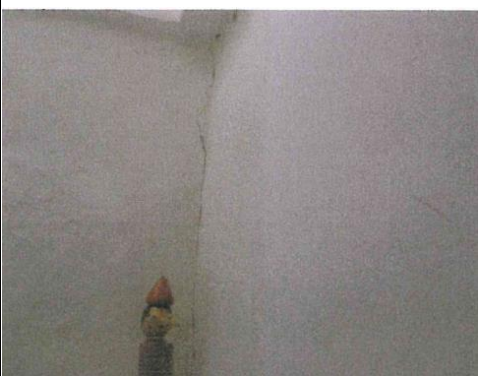
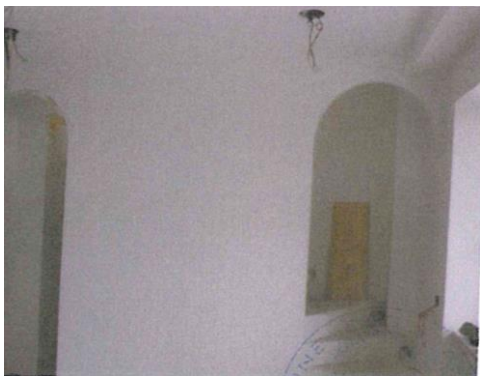
- Ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 e ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, per la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili con interventi di immediata esecuzione.
- Ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico di edifici, ad uso abitativo e produttivo, gravemente danneggiati.

Allo stato risultano complessivamente presentate, ai sensi delle predette Ordinanze Commissariali, n. 14 pratiche, delle quali n. 9, a seguito delle istruttorie effettuate dai Comuni e successiva trasmissione alla Struttura Commissariale della relativa proposta di ammissione a contributo, sono state definite mediante l'emissione del Decreto Commissariale di concessione del contributo.

Si allega scheda di dettaglio per ciascuna pratica R.C.R. definita.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME						
R.C.R.	N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	IMPORTO CONCESSO	IMPORTO EROGATO
01-2019	462	B	VIA CAVOUR, xx	XXXXXX	€ 34.470,20	RATA DI SALDO € 33.548,64
 						
LAVORI ULTIMATI						



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

R.C.R.	N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	IMPORTO CONCESSO	IMPORTO EROGATO
02/03- 2019	207	E	VIA DOTT. DE RIVAZ, xx	XXXXXX	€ 116.258,21	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
						
LAVORI IN CORSO						



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

R.C.R.	N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	IMPORTO CONCESSO	IMPORTO EROGATO
04-2019	594	B	CORSO GARIBALDI, xx	XXXXXX	€ 76.156,42	I SAL € 38.078,21
						-



LAVORI IN CORSO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

R.C.R.	N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	IMPORTO CONCESSO	IMPORTO EROGATO
05-2019	271	B	CORSO MANZI, XX	XXXXX	€ 27.457,66	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
						
LAVORI IN CORSO						

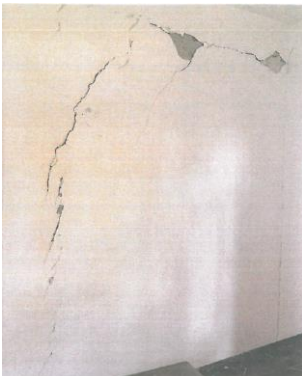
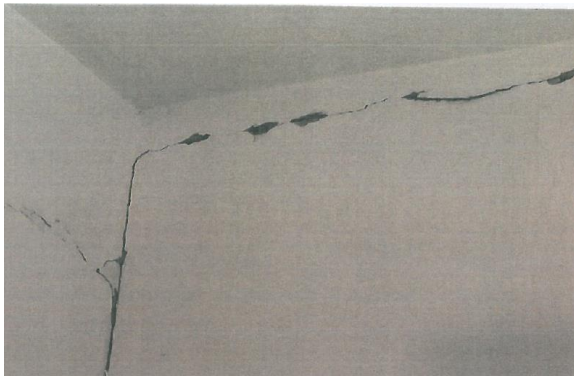
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

R.C.R.	N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	IMPORTO CONCESSO	IMPORTO EROGATO
06-2019	1723	B	VIA PRINCIPESSA MARGHERITA, XX	XXXXX	€ 58.401,65	ANTICIPO 20% - € 9.900,00
						
LAVORI IN CORSO						



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

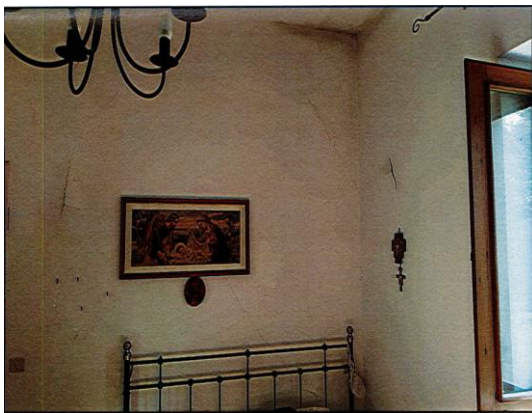
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME						
R.C.R.	N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	IMPORTO CONCESSO	IMPORTO EROGATO
08-2019	1535	B	VIA CUMANA, xx	XXXXXX	€ 63.163,17	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
						
LAVORI IN CORSO						

COMUNE DI LACCO AMENO						
R.C.R.	N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	IMPORTO CONCESSO	IMPORTO EROGATO
01-2019	479	B	VIA SAN ROCCO, xx	XXXXX	€ 61.033,52	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
						
LAVORI IN CORSO						



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

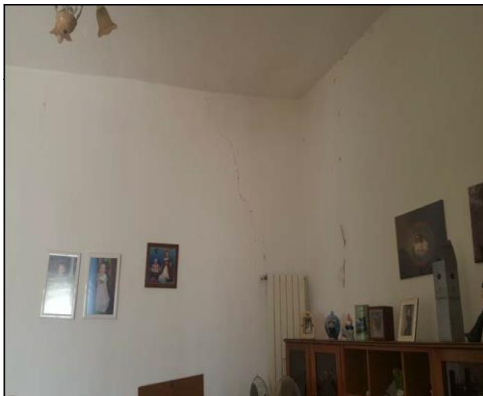
COMUNE DI LACCO AMENO						
R.C.R.	N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	IMPORTO CONCESSO	IMPORTO EROGATO
02- 2019	1647	B	VIA LITORANEA, xx	XXXXXX	€ 88.088,21	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
						
LAVORI IN CORSO						

COMUNE DI LACCO AMENO						
R.C.R.	N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	IMPORTO CONCESSO	IMPORTO EROGATO
03-2020	1445	B	VIA PROV.LE LACCO FANGO , xx	XXXXXX	€ 68.192,41	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
						
LAVORI IN CORSO						



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Le restanti 5 pratiche R.C.R., delle quali 4 redatte ai sensi delle ordinanze 2 e 4/2018 afferenti alla così detta tipologia dei “danni lievi” e una ai sensi dell’ordinanza 7/2019 (c.d. ricostruzione pesante), risultano in istruttoria presso i rispettivi comuni e si resta in attesa di ricevere le relative proposte di ammissione a contributo, che saranno valutate dalla Struttura Commissariale per la successiva emissione del Decreto di concessione del contributo.

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME					
R.C.R.	N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	STATO DEL PROCEDIMENTO
-	1847	B	CORSO VITTORIO EMANUELE, xx	XXXXXX	IN CORSO PRESSO IL COMUNE
					
					
LAVORI IN CORSO					



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

COMUNE DI LACCO AMENO					
R.C.R.	N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	STATO DEL PROCEDIMENTO
-	E5	E	VIA PROV.LE LACCO FANGO, xx	XXXXXX	IN CORSO PRESSO IL COMUNE
					
					
LAVORI ULTIMATI					



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME (ORD. 7/2019)					
R.C.R.	N°SCHEDA AEDES	ESITO AEDES	INDIRIZZO	PROPRIETARIO	STATO DEL PROCEDIMENTO
-	901	E	CORSO VITTORIO EMANUELE, xx	XXXXXX	IN CORSO PRESSO IL COMUNE
					
LAVORI IN CORSO					



8. ALLEGATO 6 – REPORT DEL PIANO PER IL RIPRISTINO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Il Commissario Straordinario, sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018, art. 26 comma 2 lettera b), si è attivato per predisporre e approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il loro ripristino definitivo, per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica.

In esecuzione:

- sono state avviate interlocuzioni, (sin dall'insediamento del Commissariato Straordinario), con i 3 Comuni interessati di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio e con la Città Metropolitana, quali soggetti attuatori degli interventi a farsi, in quanto proprietari degli immobili, che hanno rappresentato le proprie esigenze e fornito elementi utili alla quantificazione delle risorse;
- si sono tenuti, altresì, incontri e interlocuzioni con il MIUR che con propri decreti aveva già finanziato nel post-emergenza alcuni interventi finalizzati a garantire la continuità didattica del cratere e finanziato le indagini di vulnerabilità sismica su 3 edifici scolastici del comune di Casamicciola Terme, nonché finanziato un consistente intervento di adeguamento sismico e funzionale del complesso scolastico denominato “Istituto Principe di Piemonte” in Lacco Ameno;
- con Ordinanza Commissariale n. 6 del 10/05/2019, è stato, poi, approvato il 1° stralcio del piano per il ripristino dei seguenti edifici scolastici, con relativi interventi di ricostruzione/riparazione e costi di progettazione o per indagini preliminari, individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c) del D. L. n. 109/2018:
 - n. 3 di proprietà del comune di Lacco Ameno (Scuola Media Istituto Mennella in Via Fundera, Liceo Scientifico Einstein in Via Provinciale Lacco Fango, Istituto Comprensivo Mennella in Via Pannella);
 - n. 4 di proprietà del comune di Casamicciola Terme (Scuola Primaria Lembo in Via Castanito, Plesso San Severino in Via Rampe Paradisiello, Plesso Manzoni in Via Paradisiello, Istituto Ibsen in Via Principessa Margherita);
 - n. 1 di proprietà della Città Metropolitana nel comune di Casamicciola Terme (Istituto Superiore Mattei in Via Principessa Margherita);



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- n. 2 di proprietà del comune di Forio (Istituto Comprensivo Forio 2 Don Vincenzo Avallone in via Parroco L. D'Abundo e Istituto Comprensivo Forio 1 Luca Balsofiore in Via Giovanni Castellaccio).
- con Ordinanza Commissariale n. 9 del 12/02/2020, è stata approvata la rimodulazione del piano per anticipare al comune di Casamicciola Terme le somme necessarie per le indagini di vulnerabilità sismica già effettuate e l'anticipo delle somme necessarie per avviare la progettazione degli interventi dell'edificio denominato "ex Centro dell'impiego", concesso al Comune dalla Regione Campania, in comodato d'uso gratuito, per ospitare gli alunni della scuola dell'infanzia. Con la medesima Ordinanza è stato altresì finanziato l'anticipo delle somme necessarie per avviare la progettazione degli interventi dei 3 edifici di competenza del comune di Casamicciola Terme già individuati nel 1° stralcio sui quali, con fondi MIUR, erano state completate le verifiche di vulnerabilità.

Gli importi economici per la progettazione esecutiva degli interventi, pari a circa il 30% delle spese tecniche totali, impegnati dal Commissario con le suddette Ordinanze n. 6/2019 e 9/2020, ammontano a € 937.000,00 in parte già trasferiti ai soggetti attuatori che hanno provveduto ad affidare i relativi incarichi professionali.

La spesa attualmente stimata per l'attuazione degli interventi di recupero degli edifici scolastici inseriti nel piano, definita sulla base di valutazioni tecnico-economiche preliminari elaborate dai Soggetti Attuatori è, invece, pari a circa € 30.000.000,00, con finanziamento a carico sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario, di cui all'art. 19 del D. L. n. 109/2018.

Il Commissariato confida in una sollecita attività esecutiva dei Comuni e della Città Metropolitana per l'attuazione del piano scuole e ha chiesto ai Soggetti attuatori di trasmettere periodici aggiornamenti sulle attività di loro competenza in essere, sollecitando la conclusione, con ogni consentita urgenza, delle attività progettuali per tutti gli edifici scolastici individuati nel piano, stante l'urgenza di provvedere e le difficoltà più volte rappresentate dalle stesse amministrazioni di disporre di spazi adeguati per lo svolgimento delle attività scolastiche, difficoltà aggravate dall'emergenza epidemiologica Coronavirus.

Si riportano di seguito le immagini esemplificative dei danni subiti da alcuni edifici scolastici, che saranno oggetto degli interventi di cui al 1° piano stralcio e successive rimodulazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

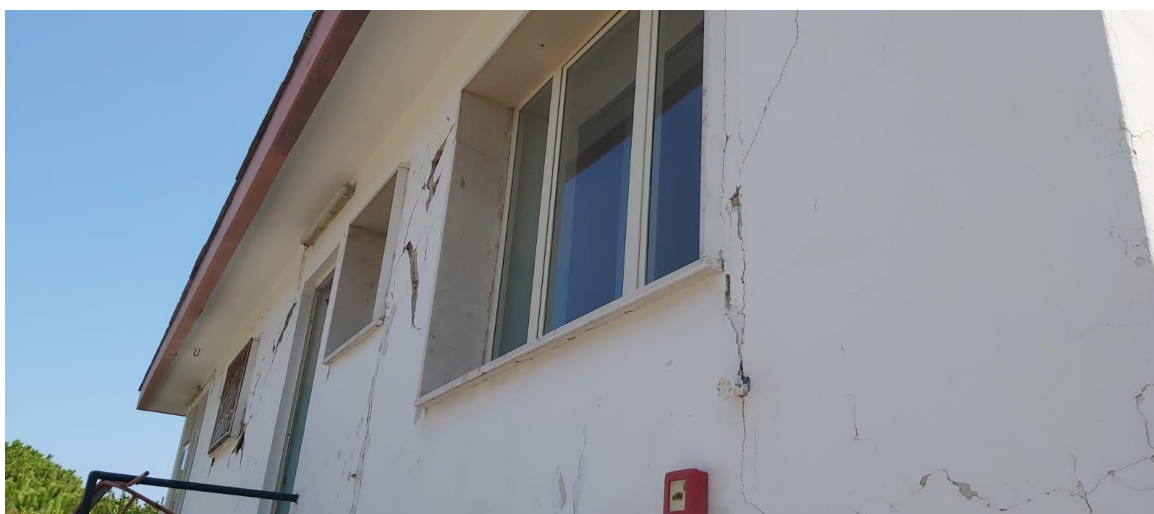
Casamicciola Terme - Istituto IBSEN





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Casamicciola Terme - Scuola primaria Lembo





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Casamicciola Terme - Plesso Manzoni





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Casamicciola Terme - Plesso San Severino





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Lacco Ameno – Istituto Principe di Piemonte

